

JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV
JCO180903J6A

Folio Fiscal
3625094F-A40B-4DDF-A7CC-9EFE4D54CC75
Fecha y Hora de Emisión
2021-07-02T08:22:36
Fecha y Hora de Certificación
2021-07-02T08:22:37

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 79860

No. de Certificado Emisor: 00001000000501220450

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
MCS650101NH1	Municipio de Cerritos, S.L.P.	101

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Servicio	80101604	Recibí del Municipio de Cerritos, S.L.P., a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 994,386.77 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77 100 MN) correspondientes a la 2da Estimación del contrato CERR-DSM-FISM-0B-2021-01-IR, y monto total de \$ 1 848,442.37 por concepto de obra consistente en: Rehabilitación de espacio multideportivo con techado y baños en la Localidad de Derramadero, Cerritos, S.L.P., la cantidad total de esta estimación es: \$ 1 000,423.81, menos Retención del 5% al millar \$4312.17, Retención del 2% al millar \$1,724.87		862434.32	862434.32

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$137,989.49


Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (77/100) M.N.

Subtotal	\$862,434.32
Impuestos Traslados	\$137,989.49
Total	\$994,386.77

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	03

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$6,037.04	Total de Traslados: \$0.00
RETENCION		
Impuesto Local Retenido	Tasa	Importe
5% al millar	0.05 %	\$4,312.17
2% al millar	0.02 %	\$1,724.87

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zij2r8bvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkLQNH7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3/y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPtiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPpxhXy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PtwOZDxwYzr/zDfT2ChmSlxjVZMvZuGCp+a4mDAPoD+56jXbS3PIAB7IV1/ITfcSOTucPkSI/U6trqSJm4Ytm38JbjztKnNjQ/TIOox+I6ZVXsKvrf/Sgid4BeNXVggFg62hyaE0DcP8VrEEtP231mHAzf8I8xluxuJ7ceQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]3625094f-a40b-4ddf-a7cc-9efe4d54cc75[2021-07-02T08:22:37]FID080111867[OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zij2r8bvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkLQNH7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3/y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPtiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPpxhXy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PtwOZDxwYzr/zDfT2ChmSlxjVZMvZuGCp+a4mDAPoD+56jXbS3PIAB7IV1/ITfcSOTucPkSI/U6trqSJm4Ytm38JbjztKnNjQ/TIOox+I6ZVXsKvrf/Sgid4BeNXVggFg62hyaE0DcP8VrEEtP231mHAzf8I8xluxuJ7ceQ==][00001000000506236653]			
	Sello Digital del SAT DUGIdL5DWeY7qBbWJQ54qdFyySGOjKbtuVoU/hNGSY/ztMPqfUpzM3agnMVpMjrUbf6bOfoczhzryBEwFzJR1C93B5YyaVIOb15Yo2IhCaNvcI7vATjTuJhXJGHKIERIKH3LVOuWzuyFQikB4o+sWUvb5qRINiUvd9iCuEgJ4H1z6aDvL9j/qY9oVC4ITEPF6rJOI6g+WR6aJWB4alwpxY8BYHSA8shqYOZW0dA8/cOpZXGH9Ihbnb+olh38n0U6sVEc8apw/K0IESzbsp7oGPcofR/6nZMXeL3YQ/TWOUepVpQG5TylFq8wJ84X1lxiNIWMPWF7vFidGA==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV
JCO180903J6A

Folio Fiscal

3625094F-A40B-4DDF-A7CC-9EFE4D54CC75

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-02T08:22:36

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-02T08:22:37

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 79860

No. de Certificado Emisor: 00001000000501220450

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
MCS650101NH1	Municipio de Cerritos, S.L.P.	101

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Servicio	80101604	Recibí del Municipio de Cerritos, S.L.P., a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 994,386.77 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77 100 MN) correspondientes a la 2da Estimación del contrato CERR-DSM-FISM-0B-2021-01-IR, y monto total de \$ 1 848,442.37 por concepto de obra consistente en: Rehabilitación de espacio multideportivo con techado y baños en la Localidad de Derramadero, Cerritos, S.L.P., la cantidad total de esta estimación es: \$ 1 000,423.81, menos Retención del 5% al millar \$4312.17, Retención del 2% al millar \$1,724.87		862434.32	862434.32

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$137,989.49

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (77/100) M.N.

Subtotal \$862,434.32
Impuestos Traslados \$137,989.49
Total \$994,386.77

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	03

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$6,037.04	Total de Traslados: \$0.00
RETENCIÓN		
Impuesto Local Retenido	Tasa	Importe
5% al millar	0.05 %	\$4,312.17
2% al millar	0.02 %	\$1,724.87

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zij2r8bvvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkILQNh7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPfiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPpxHy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PtwOZDxwYzrZdFT2ChmSxjVZMuZuGCp+a4mDAPoD+56lJXbS3PIABf7V1/tTfcSOTucPkSlU6trqSjM4Ytm38JbjztKnNjQ/TIOox+16ZVXsKvI/Sgid4BeNXVgqFg62hyaE0DcP8VrEEIP231mHAzf8l8xluxuJ7ceQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 3625094f-a40b-4ddf-a7cc-9efe4d54cc75 2021-07-02T08:22:37 FID080111867 OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zij2r8bvvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkILQNh7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPfiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPpxHy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PtwOZDxwYzrZdFT2ChmSxjVZMuZuGCp+a4mDAPoD+56lJXbS3PIABf7V1/tTfcSOTucPkSlU6trqSjM4Ytm38JbjztKnNjQ/TIOox+16ZVXsKvI/Sgid4BeNXVgqFg62hyaE0DcP8VrEEIP231mHAzf8l8xluxuJ7ceQ== 00001000000506236653			
	Sello Digital del SAT DUGIdL5DWey7qBbWJQ54qdFyySGOjKbtuuoU/hNG5Y/zMPqUpzM9agnMVPmJrUb6fOfozhzryBEwFzJR1tC93B5YyaVl0b15Y02ihCaNvcI7vATJTUJhXJGHKIERIKH3LVOuWzuyFQtkB4o+sWUvb5qRfNfUvd9/CuEgJ4l1z6aDvL9l/qY9oV/C4ITEPF6rJOt6g+WR6aJWB4alwpxY8BYHSeBshqYOZW0dA8/cDpZXGH9lbnbn+olh38n0U6sVEc8gpbvK0IESzbsp7gGPcofR/8nZMXeL3YQ/TWOUpVpQG5TgYlFq8wJ84X1ksjNtWMPWF7vFIdgA==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV
JCO180903J6A

Folio Fiscal
3625094F-A40B-4DDF-A7CC-9EFE4D54CC75

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-02T08:22:36

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-02T08:22:37

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 79860

No. de Certificado Emisor: 00001000000501220450

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
MCS650101NH1	Municipio de Cerritos, S.L.P.	101

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Servicio	80101604	Recibí del Municipio de Cerritos, S.L.P., a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 994,386.77 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77 100 MN) correspondientes a la 2da Estimación del contrato CERR-DSM-FISM-0B-2021-01-IR, y monto total de \$ 1 848,442.37 por concepto de obra consistente en: Rehabilitación de espacio multideportivo con techado y baños en la Localidad de Derramadero, Cerritos, S.L.P., la cantidad total de esta estimación es: \$ 1 000,423.81, menos Retención del 5% al millar \$4312.17, Retención del 2% al millar \$1,724.87		862434.32	862434.32

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.169000	\$137,989.49

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (77/100) M.N.

Subtotal \$862,434.32
Impuestos Traslados \$137,989.49
Total \$994,386.77

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 03
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$6,037.04	Total de Traslados: \$0.00
RETENCIÓN		
Impuesto Local Retenido	Tasa	Importe
5% al millar	0.05 %	\$4,312.17
2% al millar	0.02 %	\$1,724.87

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zj2r8bvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkLQNh7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3/y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPtiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPxy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PwOZDxwYzR/zDfT2ChmSbqVZMtZuGCp+a4mDAPoD+56lXbS3PIAB7IV1/tTfcSOTucPksIU6tr8VrEEIP231mHAz8l8xluxuJ7ceQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]3625094f-a40b-4ddf-a7cc-9efe4d54cc75 2021-07-02T08:22:37 FID080111867 OcJmYKnPpe1qhQ1YGSaA3Zj2r8bvgxp0WwWN4dhowlZQIT2qob1COqkLQNh7Yxk50JNRJkOsOkF5ras2zdgY9ZGM3/y3MZJLOTWnTFzFsa/Df6WWPtiFpGKCIsEZBE76/8aKnHn/WPxy2WzqfPanvObriekNFBpke+ggE4t8PwOZDxwYzR/zDfT2ChmSbqVZMtZuGCp+a4mDAPoD+56lXbS3PIAB7IV1/tTfcSOTucPksIU6tr8VrEEIP231mHAz8l8xluxuJ7ceQ== 00001000000506236653]			
	Sello Digital del SAT DUGIdLSDWeY7qBbWJQ54qdFyySGOjKbtuvoU/hNG5Y/ztMPqfUpzM9agnMVpMjrUbf6bfOfozhzryBEwFzJR1tC93B5YyaVl0b15Yo2ihCaNvd7vATJTUJhXJGHKIERikH3LvOuWzuyFQtkB4o+sWUvb5qRfNfUvd9lCuEgJ41z6aDvL9j/qY9oVC4ITEPF6rUOt6g+WR6aJWB4ahwpY8BYHSeBshqYOZW0dA8/cDpZXGH9Ihnb+olh38n0U6sVEc8gpw/K0IESzbsp7oGPcofR/6nZMXeL3YQ/TWOUpVpQG5YtpfQ8wJ84X1bsjNtWMPWfe7vFIdgA==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE ESTIMACION



OBRA:	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO Y BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2021
UBICACIÓN:	DERRAMADEROS, S.L.P.	AVANCE	
No. CONTRATO:	CERR-DSM-FISM/OB-2021/01-IR	FISCO	81.23%
CONTRATISTA:	JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FINANCIERO	81.23%
FONDO:	FISM	HOJA:	1 DE 1
PERIODO EST:	19 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2021		

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO		
AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL		
IMP. ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO
ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
O.C. No.	O.C. No.	O.C. No.
TOTALES DE O.C.	\$	\$

No. DE ESTIMACION	DOS
AUTORIZÓ	
LIC. LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. MARCO ANTONIO CRUZ PÉREZ. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ. COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.	LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE DE OBRA

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PAGO	
IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$ 1,848,442.37
ANTICIPO DEL 0 %:	\$ -
IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO:	\$ 1,848,442.37
IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION:	\$ 862,434.32
AMORTIZACION DEL ANTICIPO S/I.V.A.:	\$ -
SUMA:	\$ 862,434.32
I.V.A. 16 %:	\$ 137,989.49
SUB-TOTAL:	\$ 1,000,423.81
RETENCION DEL 5 AL MILLAR:	\$ 4,312.17
RETENCION DEL 2 AL MILLAR:	\$ 1,724.87
TOTAL A PAGAR NETO:	\$ 994,386.77

ESTADO DE CUENTA	
(DEL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO)	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 501,057.37
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 1,000,423.81
TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,501,481.18
IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ 346,961.19
AMORTIZADO ANTERIORMENTE:	\$ -
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
TOTAL AMORTIZADO:	\$ -
POR AMORTIZAR:	\$ -
TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO:	\$ 11,154.39
ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR:	\$ 2,159.73
PRESENTE RETENCION:	\$ 4,312.17
TOTAL RETENIDO:	\$ 6,037.04
POR RETENER:	\$ 5,117.35

No. ESTIMACION

PRESUPUESTO POR CONTRATO

AVANCES

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISCO			IMPORTE			ACUMULADO	
						1er EST.	2da EST.	3ra EST.	1er EST.	2da EST.	3ra EST.		
PRELIMINARES													
1	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/AVARILLA O MALLA INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	40.00	\$149.52	\$	5,980.80	40.00	0.00	0.00	\$	5,980.80	\$	5,980.80
2	RANURAR PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO	ML	28.00	\$108.68	\$	2,984.24	28.00	0.00	0.00	\$	2,984.24	\$	2,984.24
CIMENTACION													
3	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10cm, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	551.48	\$12.20	\$	6,727.81	551.48	0.00	0.00	\$	6,727.81	\$	6,727.81
4	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE APRIE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	91.20	\$642.62	\$	68,887.82	91.20	0.00	0.00	\$	68,887.82	\$	68,887.82
5	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA Fc= 100KG/GCM2 DE 6.0 CM DE ESPESOR.	M2	48.00	\$226.63	\$	10,830.24	48.00	0.00	0.00	\$	10,830.24	\$	10,830.24
6	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	76.03	\$422.60	\$	32,131.12	76.03	0.00	0.00	\$	32,131.12	\$	32,131.12
7	CONCRETO Fc=250 KG/GCM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	12.77	\$3,952.78	\$	50,488.10	12.77	0.00	0.00	\$	50,488.10	\$	50,488.10
8	CIMERA ACABADO APARENTE PARA CIMENTACION CON TRIPLAY PINO 16MM. Y MADERA DE PINO DE 3", INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	60.88	\$239.86	\$	12,203.80	60.88	0.00	0.00	\$	12,203.80	\$	12,203.80
9	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/GCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	658.57	\$84.60	\$	55,648.13	658.57	0.00	0.00	\$	55,648.13	\$	55,648.13
10	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 FY=4200 KG/GCM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	116.95	\$84.60	\$	9,787.87	116.95	0.00	0.00	\$	9,787.87	\$	9,787.87
11	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 AL #12 FY=4200KG/GCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS, ACARREOS Y DESPERDICIO.	KG	523.20	\$90.28	\$	47,776.18	523.20	0.00	0.00	\$	47,776.18	\$	47,776.18
ESTRUCTURA													
12	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E-70X, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSION, ESMALTE OSEL O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T.	KG	6999.00	\$106.16	\$	734,883.35	1320.00	6688.00	0.00	\$	688,086.35	\$	734,883.35
13	CIMERA EN COLUMNAS CIRCULARES CUALQUIER ALTURA CON SONOTUBO O SIMILAR ETIQUETA AZUL 30 CM DE DIAMETRO. INCLUYE DESCIMBRADO, MADERA DE REFUERZO CON DUELA DE 3 3/4". RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZAS.	ML	48.00	\$625.10	\$	30,004.80	0.00	48.00	0.00	\$	30,004.80	\$	30,004.80
14	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/GCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS	KG	187.32	\$84.60	\$	15,828.64	0.00	187.32	0.00	\$	15,828.64	\$	15,828.64
15	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #6 AL #12 FY=4200KG/GCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	884.00	\$90.28	\$	78,001.82	0.00	884.00	0.00	\$	78,001.82	\$	78,001.82
16	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA Fc=250KG/GCM2 T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE CURADO CON PAPEL KRAFT POR 72hrs, PRUEBAS DE LABORATORIO, COLADO, VIBRADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.36	\$3,952.78	\$	13,281.34	0.00	3.36	0.00	\$	13,281.34	\$	13,281.34

17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 COH1 85cm DE DESARROLLO INCLUYE DOBLES, TAQUETES Y TORNILLOS TRABAJO TERMINADO.	ML	57.20	\$527.46	\$	35,890.71	0.00	57.20	0.00	57.20	0.00	157.20	\$	-	\$	35,890.71	\$	-	\$	35,890.71
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCION (GROUT) 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLASTICA (MAXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA). INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA DE CONTACTO PERFILADO, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.65	\$2,302.61	\$	2,302.61	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	\$	-	\$	2,302.61	\$	-	\$	2,302.61
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26, INCLUYE REMACHES, GANCHOS ELEMENTOS DE FIJACION, CAELETTE	M2	468.46	\$540.36	\$	247,733.45	0.00	468.46	0.00	468.46	0.00	168.46	\$	-	\$	91,028.05	\$	-	\$	91,028.05
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBRERA DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 INCLUYE CORTES TORNILLOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO.	ML	28.30	\$520.97	\$	14,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ALBAÑILERIA																				
21	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6" 6 10/10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	44.00	\$71.65	\$	3,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
22	PISO CONCRETO FC=160 KG/CM2 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FINAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CINTA EN FRONTERA.	M2	44.00	\$418.47	\$	18,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
23	PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, ACABADO RUSTICO TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASAR Y PLASTE NECESARIO.	M2	46.12	\$160.13	\$	4,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
24	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MORDADO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	44.00	\$29.07	\$	1,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INSTALACIONES																				
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE BASE PARA RECIBIR BALAJAS DE AGUA Y BASE PARA SOPORTAR TINACOS A BASE DE PIEDRA Y CONCRETO, EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$95,264.00	\$	95,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO 102 MM. PARA BALAJA DE AGUA, INCLUYE COCOS PARA CONECTAR A TINACO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION, TRABAJO TERMINADO.	ML	20.00	\$260.67	\$	5,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
					PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA		\$	1,593,484.82	IMPORTE ESTIMADO		\$	431,946.01	\$	802,434.32	\$	-	\$	1,294,380.33		
					IVA:		\$	254,957.67	IVA:		\$	68,111.39	\$	137,998.49	\$	-	\$	207,100.88		
					TOTAL:		\$	1,848,442.39	TOTAL:		\$	501,057.39	\$	1,000,423.81	\$	-	\$	1,601,481.19		

JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EMPRESA CONTRATISTA:


LEAO, RICARDO GALVAN GALVAN.
RESIDENTE:

OBSERVACIONES:	
ELABORÓ	REVISÓ
JNDS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN.
EMPRESA CONTRATISTA:	RESIDENTE:



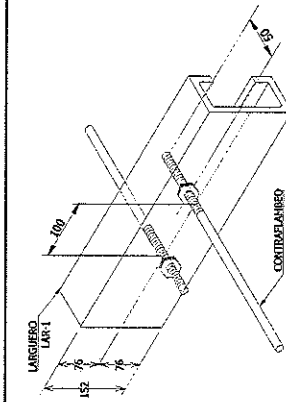
GENERADOR

CROQUIS




FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E-70X, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE OSEL-ORO Ø SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T.


LOCALIZACION		DIMENSIONES				TIPO	No. ELEMENTO	SUBTOTAL
LONGITUD	PERFIL	KG/M	P.ELEM.	PIEZAS				
CABRIAS	8.00	2 PTR 2" CAL 11	9.08	72.64	6.00	CS-1	2.00	871.6800
	8.00	2 PTR 2" CAL 11	9.08	72.64	6.00	CI-1	2.00	871.6800
	0.77	2 PTR 2" CAL 11	9.08	7.02	6.00	CI-2	2.00	84.2261
	0.85	PTR 1 1/2" CAL	3.29	2.80	6.00	M-1	13.00	218.3836
	1.43	PTR 1 1/2" CAL	3.29	4.70	6.00	D-1	10.00	282.2820
	0.82	2 PTR 1 1/2" C	6.58	5.37	6.00	M-2	4.00	128.8627
	0.80	PTR 1 1/2" CAL	3.29	2.63	6.00	D-1	2.00	31.5840
	0.63	2 PTR 1 1/2" C	6.58	4.15	6.00	D-2	4.00	99.4896
	8.00	CF 6" CAL 14	4.53	36.24	6.00	LAR-1	14.00	3044.1600
	8.00	2 CF 6" CAL 14	9.06	72.48	6.00	LAR-2	2.00	869.7600
	8.00	OS D=1/2"	0.99	7.92	6.00	CVE-1	4.00	190.0800
	8.00	OS D=1/2"	0.99	7.92	6.00	CVE-1	4.00	190.0800
	1.52	OS D=1/2"	0.99	1.50	6.00	CFB-1	11.00	99.3168
	0.14	LI 4" X 1/4"	9.90	1.40	6.00	Clip	16.00	134.4000
	0.70	OS D=3/4"	2.25	1.58	6.00	AN-1	12.00	113.4000
ELEMENTOS DE CUBIERTA								
LARGO	ANCHO							
0.30			10.56	6.00	PL-1	2.00	126.7200	
0.28	0.10		2.11	6.00	PL-2	4.00	50.6400	
0.05	0.05		0.25	6.00	PL ANCLA	12.00	17.9680	
0.06	0.08		0.12	6.00	CBN-1	8.00	5.7600	
0.15	0.06		0.45	6.00	CELVIS 1	32.00	86.0370	
0.06	0.06		0.18	6.00	CELVIS 2	32.00	34.4148	
0.20	0.05		0.51	6.00	CVE-1	8.00	24.3772	
0.20	0.06		0.60	6.00	CVE-2	8.00	28.6790	
0.47	0.06		1.51	6.00	Refuerzo pla	4.00	36.1738	
0.40	0.14		2.75	6.00	Refuerzo pla	2.00	33.0406	
0.47	0.14		3.30	6.00	Refuerzo pla	2.00	39.5651	
0.17	0.14		1.19	6.00	Refuerzo pla	2.00	14.2200	
TOTAL								7.726.981

[illegible]


DETALLE DE CONTRAFLAMBEO
(ISOMETRICO ACOTA MM)




COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBO EN CLINTON



VER DETALLE DE CONTRASTAJES EN CUMBRERA



DETALLE DE CLIP



DETALLE DE CELVIS
COSMETICO & COUTURE

TARIFA DE PERIODES

ELEMENTOS DE CUBIERTA		PESO (kg/m ²) (kg/m ²)
FORRO FRENTE		
CR-1	OS 7 = 12" OS 9 = 12.7 mm	2530
CR-1	OS 7 = 12" OS 9 = 12.7 mm	2530
CR-1	CF 14 CF 14	2530
CR-2	CF 14 CF 14	2530
CR-3	CF 14 CF 14	2530
CR-4	CF 14 CF 14	2530
CR-5	CF 14 CF 14	2530



CROQUIS

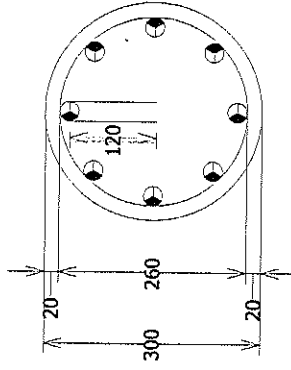
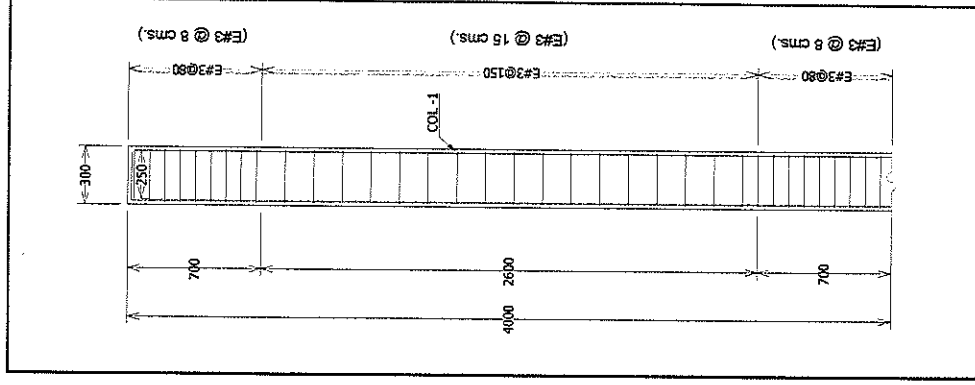
CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES CUALQUIER ALTURA CON SONOTUBO O SIMILAR ETIQUETA AZUL 40 CM DE DIAMETRO. INCLUYE DESCIMBRADO, MADERA DE REFUERZO CON DUELA DE 3"X3" RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZAS.

[illegible]



CROQUIS


AGERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 F"=420KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS

[illegible]

~~8~~ 8 VAR $\phi = 3/4"$
E $\phi = 3/8"$ @ 150 mm

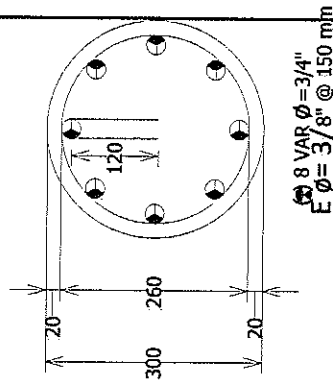
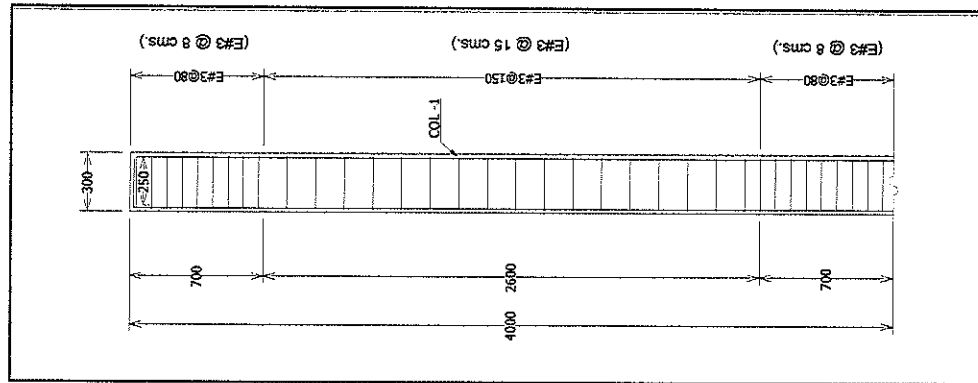
COL-1

COLUMN

**HOJA DE NUMEROS GENERADORES**

GENERADOR

CROQUIS

[illegible]


COL-1

COLUMN

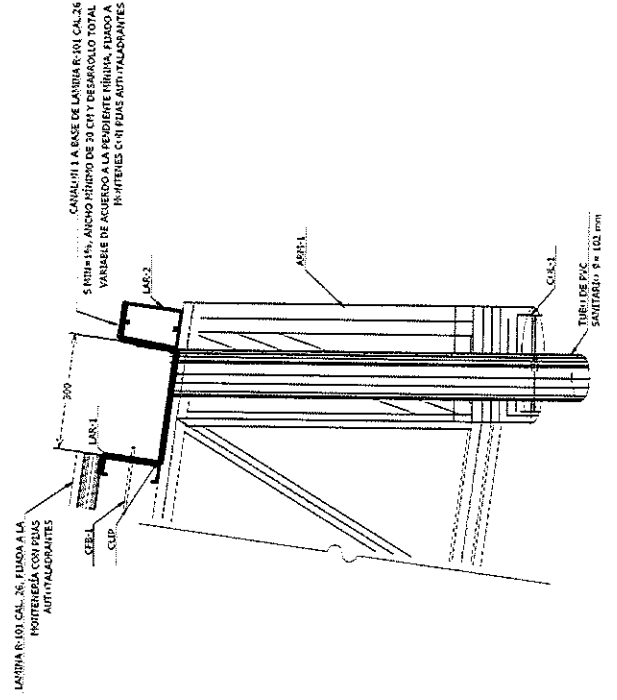



GENERADOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 CON 89cm DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS TRABAJO TERMINADO.

[illegible]

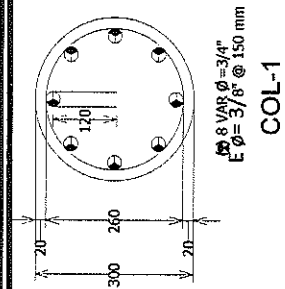
DETALLE DE CANALON
(SECCION) - ACOTAC: 07m)





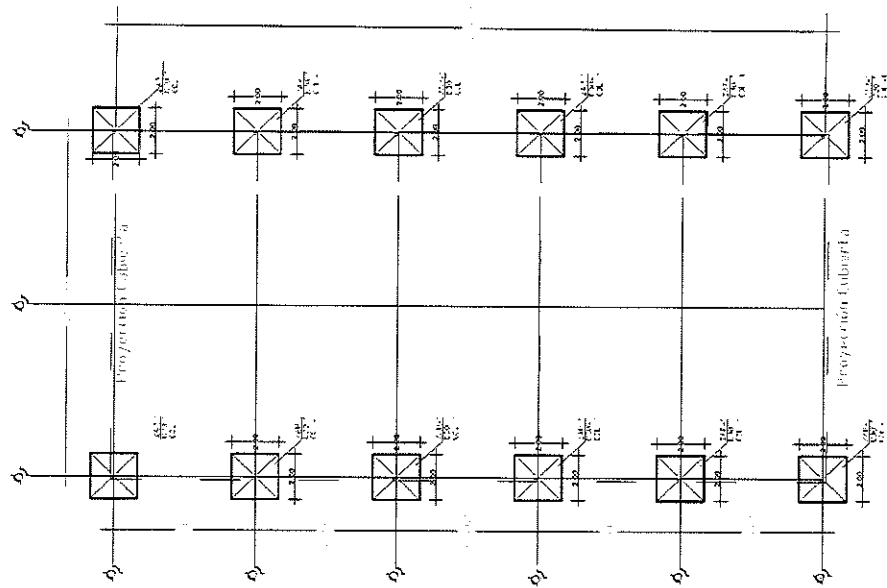
LUGAR	DERRAMADEROS, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.			FECHA	12/03/2021
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO (16.20 m X 28.30 m)			CLAVE	12103
PARTIDA	ESTRUCTURA			UNIDAD	M2
DESCRIPCION DEL CONCEPTO					

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCIÓN (GROUT) 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLÁSTICA (MÁXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA), INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA DE CONTACTO PERFILADO, TRABAJO TERMINADO.

[illegible]

COL-1

COLUMN





CROQUIS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

LOCALIZACION		DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO			
1-3	A-F	28.600	16.600		474.760	1.000	474.7600

Technical drawing of a 'BLENADOR DE MARCO' (Frame Blinder). The drawing includes a side elevation and a cross-section.

Side Elevation:

- Overall width: 1100
- Overall height: 1000
- Section line: A-A
- Labels: BLENADOR DE MARCO

Cross-section (A-A):

- Shows the internal structure of the blinder, including a central panel and side supports.
- Labels: A-A

474.760
