

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:

En esta fecha se dan por iniciados los trabajos de la obra "Rehabilitación de 3 puentes Vehiculares en camino San Ciró-La Trinidad".

Este día se ubico y trazo el primer puente, además se comenzó el desazolve del canal y la excavación del cajón para el desplante de los muros y columnas.

### CROQUIS:

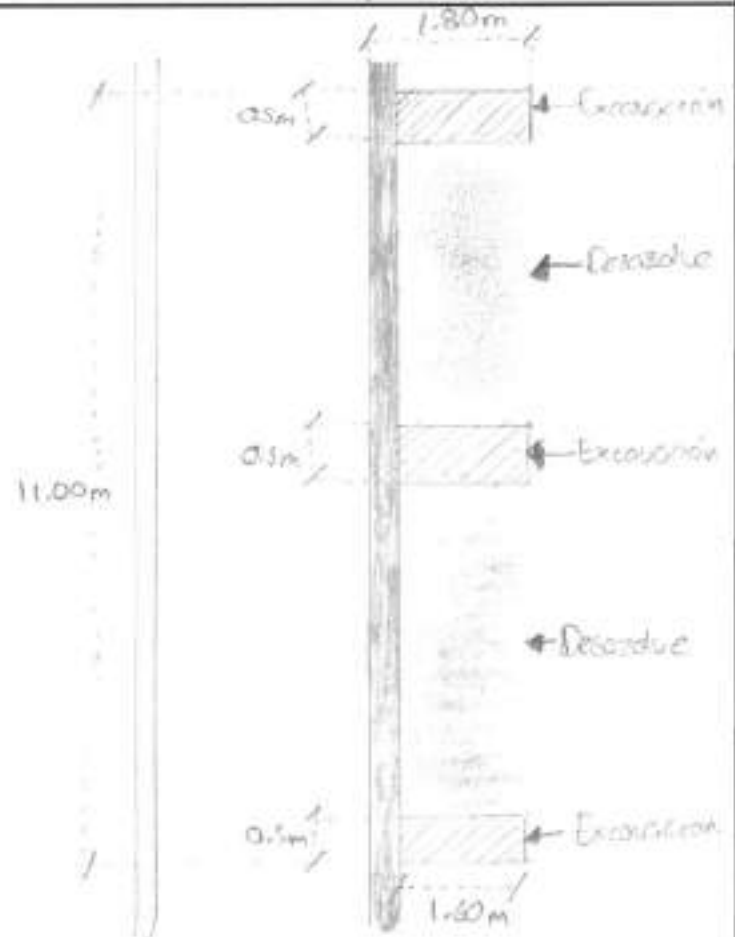

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:


En la visita de obra de este día se observó que el suelo donde se comenzará a desplantar los muros de concreto a ciclopes se compactaron de manera correcta.

Se comenzó la colocación de el concreto a ciclopes y los columnas de concreto.

CROQUIS:

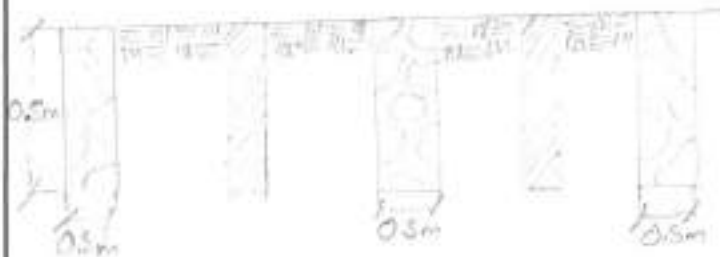

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:



FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

Para esta visita, en el primer puente se tenía listo el muro de concreto de ciclopes, así como el piso de concreto contemplados en la parte inferior de este puente.

Posteriormente a esto, se movilizaron los trabajadores para iniciar con las actividades en el puente no. 3, donde se inicio el desazolve y excavación.

## CROQUIS:

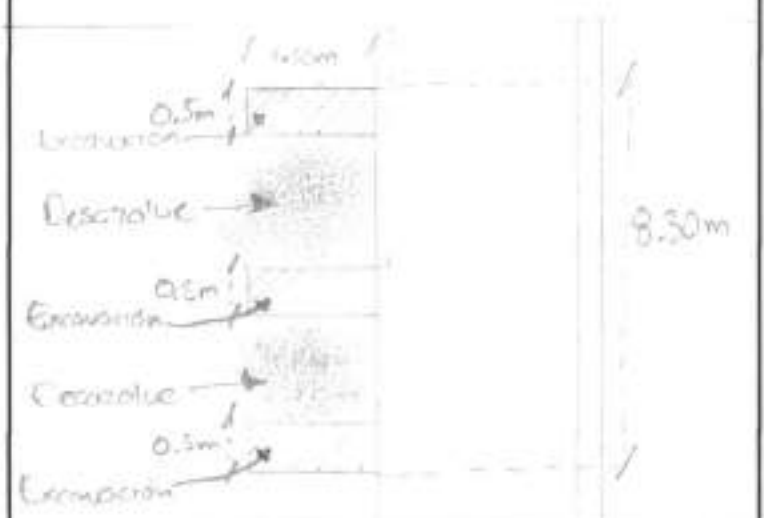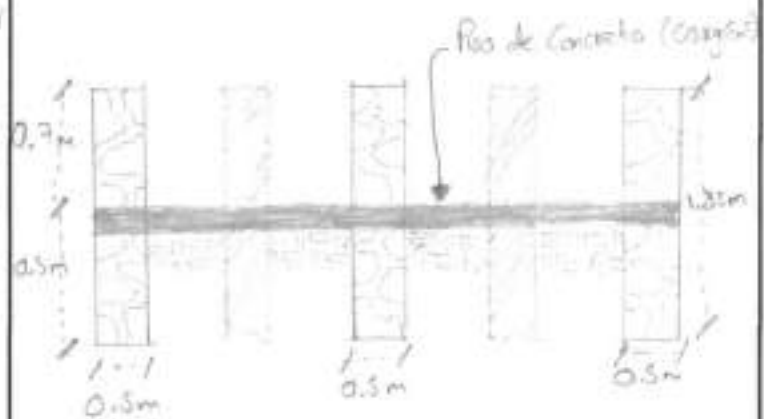

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE 3 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO SAN CIRO - LA TRINIDAD".

No. CONTRATO: MSC-R33-FFM-2AD3/UB/02/OB/2-03/21

CONTRATISTA: ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ

FONDO: FFM

24 NOVIEMBRE 2021

En esta semana se inició con los trabajos contemplados en la obra de "Rehabilitación de 3 puentes vehiculares en camino San Ciró - La Trinidad", con lo cual se comenzó con el desazolve del canal y la excavación de los cajones para el desplante del muro y las columnas para el primer puente. -



ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA

SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE 3 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO SAN CIRO - LA TRINIDAD".

No. CONTRATO: MSC-R33-FFM-2AD3/UB/02/OB/2-03/21

CONTRATISTA: ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ

FONDO: FFM

01 DICIEMBRE 2021

En esta fecha se logro culminar con el muro de concreto de ciclópeo, así como las columnas y el piso de 8 cm de espesor contemplados en los trabajos para el 1er puente, además se comenzaron los trabajos de excavación y desazolve en el puente no. 3.



ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA

SUPERVISOR DE OBRA
