



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO. 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: "REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P."

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS. S.L.P.

METAS: 24.30 M3

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-2-2022

IMPORTE: \$

807,838.62

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____ \$ _____

REDUCCION: _____ \$ _____

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FECHA DE INICIO: 04 de agosto del 2022

REPRESENTANTE: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FECHA DE TERMINO: 09 de octubre del 2022

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P



HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: "REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P."

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS. S.L.P.

METAS: 24.30 M3

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-2-2022

IMPORTE: \$807,838.62


MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.


FECHA DE INICIO: 04 de agosto del 2022

REPRESENTANTE: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.


FECHA DE TERMINO: 09 de octubre del 2022



ELEVACION 01



ELEVACION 02



ELEVACION 03

CONTRATISTA	SUPERVISOR	Vo. Bo.
ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.	 LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.	ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ
REPRESENTANTE	ASESOR TECNICO.	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P
JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.



FOLIO
1

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P."

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-2-2022**

FECHA: 04 de agosto del 2022


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

EN ESTA FECHA SE PROCEDE LA APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA
RELATIVA A ESTA OBRA.

SE DA INICIO LOS TRABAJOS CON LIMITACION DEL AREA
DE TRABAJO CON BANDAS DE PROTECCION Y ACORDONAMIENTO

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE CONCRETO
COMO PAVIMENTOS O ELEMENTOS MONOLITICOS POR
METODOS MANUALES.

CROQUIS

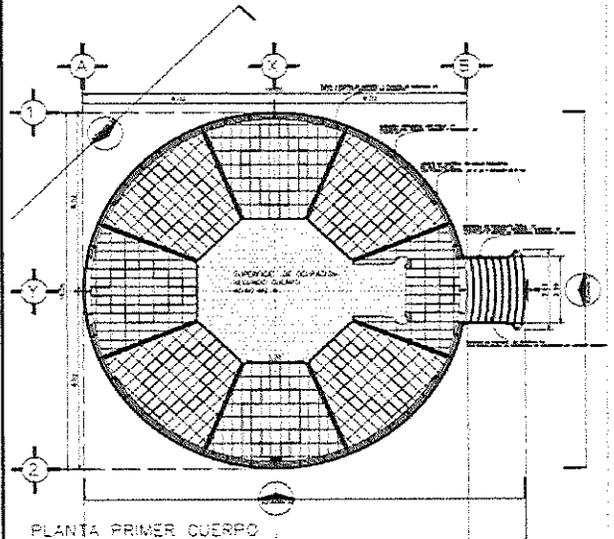

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

FOLIO
2

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P."

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-2-2022**

FECHA: 12 de agosto del 2022

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CROQUIS						
<p>EN ESTAS FECHAS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE</p> <p>RETIRO DE ELEMENTOS DE CANTERA SE REALIZO POR MEDIOS MANUALES QUE FUERON MARRO DE MANO, CINCELES, ESPATULAS Y LIEMPIEZA DEL AREA CON BROCHA.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ESCALONES DE PRIMERA ESCALINATA</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8 pzas</td> </tr> <tr> <td>ESCALONES DE SEGUNDA ESCALINATA</td> <td style="text-align: right;">15 pzas</td> </tr> <tr> <td>ESCALONES EN SEGUNDO CUERPO</td> <td style="text-align: right;">15 pzas</td> </tr> </table>	ESCALONES DE PRIMERA ESCALINATA	8 pzas	ESCALONES DE SEGUNDA ESCALINATA	15 pzas	ESCALONES EN SEGUNDO CUERPO	15 pzas	<p style="font-size: x-small;">PLANTA PRIMER CUERPO</p> <p style="font-size: x-small;">PLANTA SEGUNDO CUERPO</p>
ESCALONES DE PRIMERA ESCALINATA	8 pzas						
ESCALONES DE SEGUNDA ESCALINATA	15 pzas						
ESCALONES EN SEGUNDO CUERPO	15 pzas						

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



FOLIO
3

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P."

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-2-2022**

FECHA: **23 de agosto del 2022**


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

EN ESTAS FECHAS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE
RETIRO DE ELEMENTOS DE CANTERA SE REALIZO POR MEDIOS
MANUALES QUE FUERON MARRO DE MANO, CINCELES,
ESPATULAS Y LIEMPIEZA DEL AREA CON BROCHA.

ESCALONES EN SEGUNDO CUERPO	6 pzas
BASE ANGULADA	8 pzas
LINGOTE PERIMETRAL PRIMER CUERPO	70 pzas

RETIRO DE APLANADOS POR MEDIOS MANUALES QUE FUERON EL
CINCEL, MARRO, ESPATULAS, ACARREOS A PALA, Y CARRETILLA
LIMPIEZA DEL MURO DESNUDO CON CEPILLO DE CERDAS
DE PLASTICO

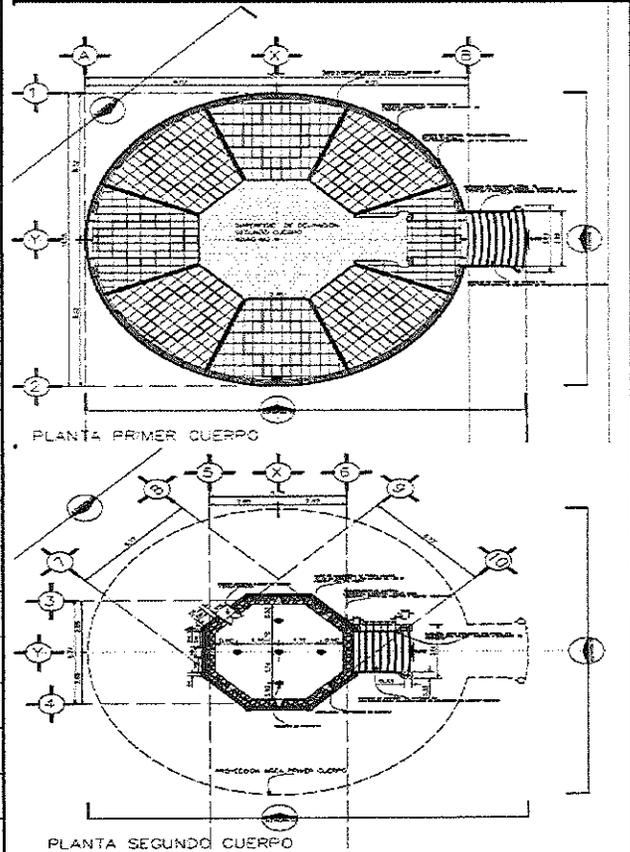

EJECUTOR

SUPERVISOR

Vo. Bo.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

ASESOR TECNICO.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
