

No. Contrato. AO-83-W19-924037999-N-18-2023

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"  
"RENDIMIENTOS FINANCIEROS"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **AO-83-W19-924037999-N-18-2023**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la colonia **Nuevo Progreso**, municipio de **San Luis Potosí** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **31 de Agosto 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos unidad SLP III** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL**, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos unidad SLP III, con clave de centro de trabajo 24ETC0003N, col. Nuevo Progreso, San Luis Potosí, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número AO-83-W19-924037999-N-18-2023 es de **\$357,304.98**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número AO-83-W19-924037999-N-18-2023 es de **\$ 0.0**
- **Importe Total: \$357,304.98**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:  
Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **24 de Julio 2023**

Fecha de terminación: **21 de Septiembre 2023**



Plazo de ejecución: **60 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **24 de Julio 2023**

Fecha de terminación: **31 de Agosto 2023**

Plazo de ejecución: **39 días días naturales**





V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	14 JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2023	\$229,059.06	\$36,649.45	\$265,708.51	
02 EXCD FINIQUITO	15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	\$78,962.47	\$12,634.00	\$91,596.47	
<b>TOTAL</b>		<b>\$308,021.53</b>	<b>\$49,283.45</b>	<b>\$357,304.98</b>	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Sofimex, Institución de Garantías, SA de CV, fianza N°. 2814552 de fecha 19 de Julio 2023.

ORGANISMO ESTATAL

Organismo Responsable de la INFE  
EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ

CONTRATISTA

Ing Isela Monserrat Arvizo  
Representante Legal Empresa  
CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.AO-83-W19-924037999-N-18-2023 de fecha 31 de Agosto 2023.

No. Contrato. IR-INIFED-PC-06-2023

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IR-INIFED-PC-06-2023**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **Salinas**, municipio de **Salinas de Hidalgo** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **24 de Mayo del 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **Escuela Secundaria JESUS SILVA HERZOG** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, Escuela Secundaria JESUS SILVA HERZOG, con clave de centro de trabajo 24DES0106T, Salinas, Salinas de Hidalgo, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IR-INIFED-PC-06-2023** es de **\$764,724.86**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IR-INIFED-PC-06-2023** es de **\$128.39**
- **Importe Total: \$764,853.25**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **16 de Febrero del 2023**

Fecha de terminación: **24 de Mayo del 2023**


Plazo de ejecución: **98 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 de Febrero del 2023**

Fecha de terminación: **24 de Mayo del 2023**

Plazo de ejecución: **98 días naturales**

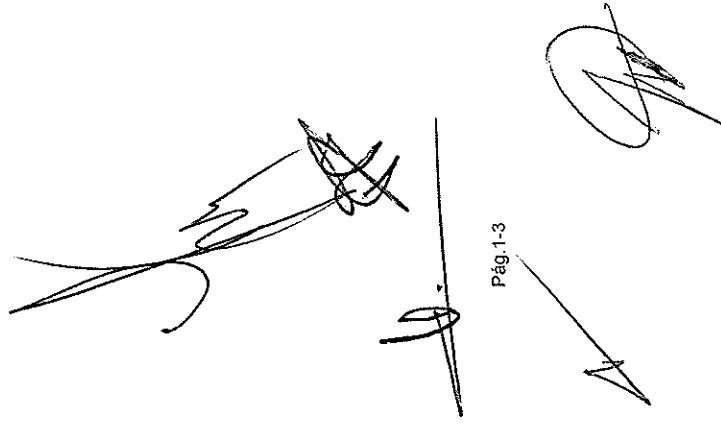

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 Febrero al 16 Marzo del 2023	\$113,199.31	\$18,111.89	\$131,311.20	
02	17 Marzo al 11 Abril del 2023	\$236,748.79	\$37,879.81	\$274,628.60	
03	12 de Abril al 12 Mayo del 2023	\$222,895.44	\$35,663.27	\$258,558.71	
04	13 al 18 de Mayo del 2023	\$27,742.09	\$4,438.73	\$32,180.82	
05 EXCD FINIQUITO	19 al 24 de Mayo del 2023	\$8,770.62	\$9,403.30	\$68,173.92	
<b>TOTAL</b>		<b>\$659,356.25</b>	<b>\$105,497.00</b>	<b>\$764,853.25</b>	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista C. JORGE CHAVEZ GODINEZ hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:


- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- Plano General (de conjunto) del Plantel.



**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., Fianza No. 2767102 de fecha 13 de Febrero del 2023.

**ORGANISMO ESTATAL**





Organismo Responsable de la INFE  
LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

**TESTIGOS**

  
Representante del CEPS  
Santiago Rodríguez Esquivel


**CONTRATISTA**

  
C. JORGE CHAVEZ-GODINEZ  
Representante Legal Empresa  
C. JORGE CHAVEZ GODINEZ

  
ARO LISENHUARA DE LA CRUZ  
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE  
PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.IR-INIFED-PC-06-2023 de fecha 24 de Mayo del 2023.



  
Pag 3-3



No. Contrato. LO-924037999-E42-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E42-2022**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la localidad de **San Luis Potosí**, municipio de **San Luis Potosí** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **07 Junio del 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN, con clave de centro de trabajo 24MSU0011E, San Luis Potosí, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E42-2022** es de **\$8,009,716.08**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **LO-924037999-E42-2022** es de **0.0**
- **Importe Total: \$8,009,716.08**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente.

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: **25 de Octubre 2022**

Fecha de terminación: **28 de Febrero 2023**

Plazo de ejecución: **127 Dias naturales**

Conforme al Diferimiento por anticipo:

Fecha de inicio: **15 de Diciembre 2022**

Fecha de terminación: **20 de Abril 2023**

Plazo de ejecución: **127 Dias naturales**

Conforme al Diferimiento:

Fecha de inicio: **21 de Abril 2023**

Fecha de terminación: **03 de Mayo 2023**

Plazo de ejecución: **140 Dias naturales**

Conforme al Diferimiento:

Fecha de inicio: **04 de Mayo 2023**

Fecha de terminación: **07 Junio del 2023**

Plazo de ejecución: **225 Dias naturales**



**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	15 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$803,167.38	\$128,506.78	\$931,674.16	
02 EXCD	15 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$54,877.33	\$8,780.37	\$63,657.70	
03	01 AL 31 ENERO 2023	\$1,224,789.29	\$195,966.29	\$1,420,755.58	
04	01 AL 28 FEBRERO 2023	\$426,507.06	\$68,241.13	\$494,748.19	
05	01 AL 31 MARZO 2023	\$557,503.61	\$89,200.58	\$646,704.19	
06	01 AL 30 ABRIL 2023	\$2,605,529.38	\$416,887.70	\$3,022,414.08	
07	01 AL 31 MAYO 2023	\$707,006.27	\$113,121.00	\$820,127.27	
08 EXCD	01 AL 31 MAYO 2023	\$432,644.78	\$69,223.16	\$501,867.94	
09 FNTO	01 AL 07 JUNIO 2023	\$92,902.56	\$14,864.41	\$107,766.97	
<b>TOTAL</b>		<b>\$6,904,927.66</b>	<b>\$1,104,788.42</b>	<b>\$8,009,716.08</b>	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- **CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- Plano General (de conjunto) del Plantel.





**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Dorama, Institución de Garantías, S.A., fianza No. 1686233 de fecha 19 de Octubre 2022.

**ORGANISMO ESTATAL**

Organismo Responsable de la INFE  
LEAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ

**CONTRATISTA**

ARQ. ENRIQUE MARTINEZ BARCENAS  
Representante Legal Empresa —  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.  
VENADO, S.A. DE C.V.

**TESTIGOS**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.LO-924037999-E42-2022 de fecha 07 Junio del 2023.

OBRA:	REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL DEL PLANTEL	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023, NIVEL BÁSICO, REGULAR.
CLAVE DE ESCUELA:	24DST0051Z	CLAVE DE OBRA:	234002
NOMBRE ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-4-2023
LOCALIDAD:	ESCALERILLAS	FECHA DE INICIO:	21/03/2023
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSÍ	FECHA TERMINACIÓN:	17/05/2023

EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44, ESCALERILLAS, S.L.P., EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2023, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA		A	L	T	L
AMPLIACIÓN		LABORA	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC.
REHABILITACIÓN	X	TORIO			LOCALES
TERMINACIÓN					
EQUIPO Y MOBILIARIO					
LOCALES EDUCATIVOS:	REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL DEL PLANTEL.				
OBRA EXTERIOR:	-				
TIPO DE ESTRUCTURA:	-				

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
ESTIMACIÓN	IMPORTE	CONSTRUCCIÓN:	\$764,421.78
1	\$674,477.38	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00
2 FIN	\$89,944.40	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00
TOTAL:	\$764,421.78	TOTAL:	\$764,421.78
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.			

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.



S.E.G.E.  
 ESC. SEC. ITC. NO. 44  
 CLAVE: 24DST0051Z  
 ESCALERILLAS, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**



**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:  
 EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.  
 LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A PROFR. HECTOR TORRES CALDERON QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

- 1.- OBRA CIVIL
  - 1.1.- EDIFICACIÓN : 0%
  - 1.2.- OBRA EXTERIOR 100%
  - 2.- MOBILIARIO 0%
  - 3.- EQUIPO 0%
- (VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL I.E.I.F.E.	
LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.	LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO
LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ DIRECTOR JURÍDICO DEL I.E.I.F.E.	S.E.G.E. ESC. SEC. TEC. No. 20 PROFR. HECTOR TORRES CALDERON ESCALERINEROS DEL PLANTEL
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.	POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OBSERVACIONES:	LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EAO. ULISES GIOVANNI SALAZAR CORONADO RESIDENTE DE OBRA DEL I.E.I.F.E.	CONSTRUCTORA VIG 21, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

No. Contrato. LO-924037999-E35-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E35-2022**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el municipio de **Ebano** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **31 de Agosto 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS V UNIDAD ÉBANO (2DA. ETAPA)** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS V UNIDAD ÉBANO (2DA. ETAPA), con clave de centro de trabajo 24ETC0005L, Ebano, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número LO-924037999-E35-2022 es de **\$4,839,200.50**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número LO-924037999-E35-2022 es de **\$ 1,478,260.08**
- **Importe Total: \$6,317,460.58**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.  
 Fecha de inicio: **27 de Septiembre 2022**  
 Fecha de terminación: **17 Enero 2023**  
 Plazo de ejecución: **113 días naturales**

Conforme al Diferimiento:  
 Fecha de inicio: **14 de diciembre 2022**  
 Fecha de terminación: **05 de Abril 2023**  
 Plazo de ejecución: **113 días naturales**

Conforme a la Ampliación periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 de Abril 2023**  
 Fecha de terminación: **31 de Mayo 2023**  
 Plazo de ejecución: **169 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:  
 Fecha de inicio: **27 de Septiembre 2022**  
 Fecha de terminación: **31 de Agosto 2023**  
 Plazo de ejecución: **339 días naturales**




SEP/SEMS  
 CECYTE

PLANTEL V 'EBANO'  
 CLAVE 24ETC0005L  
 EBANO, S.L.P.

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	14 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$400,998.77	\$64,159.80	\$465,158.57	
02	01 AL 31 ENERO 2023	\$498,077.52	\$79,692.40	\$577,769.92	
03	01 AL 28 FEBRERO 2023	\$930,797.44	\$148,927.59	\$1,079,725.03	
04	01 AL 15 MARZO 2023	\$454,882.97	\$72,781.28	\$527,664.25	
05 EXDT	01 AL 31 MARZO 2023	\$508,766.37	\$81,402.62	\$590,168.99	
06	16 AL 15 MARZO 2023	\$611,770.82	\$97,883.33	\$709,654.15	
07 EXDT	01 AL 30 ABRIL 2023	\$1,315,122.17	\$210,419.55	\$1,525,541.72	
08	01 AL 30 MAYO 2023	\$637,526.92	\$102,004.31	\$739,531.23	
09 EXCD FINIQUITO	31 MAYO AL 31 AGOSTO 2023	\$88,143.72	\$14,103.00	\$102,246.72	
<b>TOTAL</b>		<b>\$5,446,086.70</b>	<b>\$871,373.88</b>	<b>\$6,317,460.58</b>	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.




*[Handwritten signature]*

SEPISEM  
CECYTE  
PLANTEL V EBANO  
CLAVE 24ETC0006  
EBANO, S.L.P.


*[Handwritten signature]*

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Sofimex, Institución de Garantías, S.A. de C.V., fianza N°. 2712880 de fecha 23 de Septiembre 2022.

  
**ORGANISMO ESTATAL**

Organismo Responsable de la INFE  
ING. KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS

  
Alfredo Huerta




CECITE

PLANTEL Y TERMINO TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION  
CLAVE 24ET030003 DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA  
ERANO, S.L.P. EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

**CONTRATISTA**



C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA  
Representante Legal Empresa  
C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA

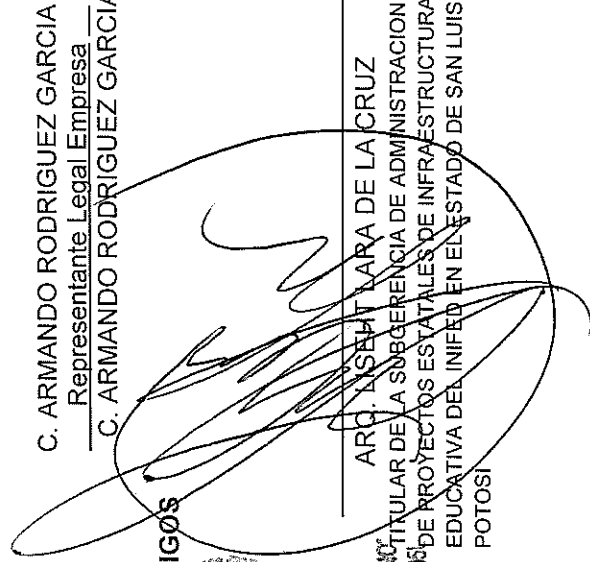

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.LO-924037999-E35-2022 de fecha **31 de Agosto 2023**.



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

**IEIFE**  
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 1/2

<b>CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00M. INCLUYE: RED ELECTRICA, ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA</b>	
OBRA:	24DPR1729L	PROGRAMA:	224020
CLAVE DE ESCUELA:	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	CLAVE DE OBRA:	IR-O-EST-247800010-27-2022
NOMBRE ESCUELA:	CIUDAD VALLES	Nº DE CONTRATO:	22/12/2022
LOCALIDAD:	CIUDAD VALLES	FECHA DE INICIO:	
MUNICIPIO:		FECHA TERMINACIÓN:	25/03/2023

EN EL PLANTEL PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD VALLES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

**TRABAJO EJECUTADO: DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

OBRA NUEVA	X	L	T	A	L
AMPLIACIÓN					
REHABILITACIÓN					
TERMINACIÓN					
EQUIPO Y MOBILIARIO	X				

A	L	T	A	L
AULAS	LABORA TORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
-	-	-	-	-

LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, MOBILIARIO; MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO 13 PZAS., PINTARRÓN METÁLICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO 1 PZA., SILLA ESPECIAL PARA MAESTRO 1 PZA., SILLA METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO 26 PZAS., ESCRITORIO PARA MAESTRO 1 PZA.
OBRA EXTERIOR:	ANDADORES 18.76 MZ.
TIPO DE ESTRUCTURA:	REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.


**RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS**

APROBADOS:		INVERSION EJERCIDA:	
ESTIMACION	IMPORTE	CONSTRUCCIÓN:	
1	\$433,597.75	GASTOS INDIRECTOS:	\$1,734,390.97
2	\$433,597.75	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00
3	\$433,597.75	TOTAL:	\$1,734,390.97
4 FIN	\$433,597.72		
<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,734,390.97</b>		

\* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE POTOSÍ  
TIERRA Y LIBERTAD  
C.C.T. 24DPR1729L/IEIFE/EOB/CN/10.0.  
COL. EL CAVALIÁN  
CD VALLES 219



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:  
 EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A PROFR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROQUE QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL






- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

- 1.1.- EDIFICACIÓN :
- 1.2.- OBRA EXTERIOR

- 100%
- 100%
- 100%
- 0%

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL I.E.I.F.E.  LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.	 LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO DEL I.E.I.F.E.	RECIBE POR EL PLANTEL  PROFR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROQUE DIRECTOR DEL PLANTEL
ING. ERNESTO VARGAS TNAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.	POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
OBSERVACIONES:  KEVIN EDUARDO LÓPEZ RIGS RESIDENTE DE OBRA DEL I.E.I.F.E.	 GRUPO MAGALDI-S.A. DE C.V. CONTRATISTA



**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA 3a. ETAPA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS "P"	PROGRAMA:	CONVENIOS 2022
CLAVE DE ESCUELA:	24EUT0001E	CLAVE DE OBRA:	220804
NOMBRE ESCUELA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-17-2022
LOCALIDAD:	RANCHO NUEVO	FECHA DE INICIO:	28/10/2022
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	FECHA TERMINACIÓN:	05/02/2023

EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2023, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA					
AMPLIACIÓN					
REHABILITACIÓN	X				
TERMINACIÓN					
EQUIPO Y MOBILIARIO					
LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCIÓN DE LA 3a. ETAPA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS "P"; SUMINISTRO Y HABILITADO MALLA ELECTROSOLDADA 673.12 M². PISO CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR 673.12 M², EMBOQUILLO (REPARACIONES) 16.33 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA 10.66 M². SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA ALUMINIO CON CRISTAL REFLECTA BRONCE DE 6 MM.				
OBRA EXTERIOR:	-				
TIPO DE ESTRUCTURA:	-				

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:		INVERSION EJERCIDA:
ESTIMACION	IMPORTE	CONSTRUCCIÓN:
1	\$710,427.33	GASTOS INDIRECTOS:
2	\$481,381.71	MOBILIARIO Y EQUIPO:
3	\$237,097.16	TOTAL:
4 FINIQUITO	\$179,240.73	\$1,608,146.93
TOTAL:	\$1,608,146.93	\$48,244.41
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.		\$0.00
		\$1,656,391.34

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

Asenett  
Carrizales

*[Signature]*

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:  
EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACIÓN

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES:

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL GERARDO JAVIER VILET ESPINOSA QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL





1.1.- EDIFICACIÓN : REHABILITACIÓN

2.- MOBILIARIO  
3.- EQUIPO

1.2.- OBRA EXTERIOR

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL I.E.I.F.E.	
LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.	LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO DEL I.E.I.F.E.	RECIBE POR EL PLANTEL  GERARDO JAVIER VILET ESPINOSA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.	POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OBSERVACIONES:  EAO. ULISES GIOVANNI SALAZAR CORONADO RESIDENTE DE OBRA DEL I.E.I.F.E.   Asenett Carrizales ING. INGRID ASENETT GARCÍA CARRIZALES CONTRATISTA	





No. Contrato. IO-924037999-E10-2022-A

**POTENCIACION DE RECURSOS DEL FAM ESCUELAS AL CIEN**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E10-2022-A**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el municipio de **EBANO** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **27 de Julio 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, con clave de centro de trabajo 24DES0105U, EBANO, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E10-2022-A es de **\$1,428,034.70**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E10-2022-A es de **\$ 7,170.28**
- **Importe Total: \$1,435,204.98**

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:  
Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 de Mayo 2022**

Fecha de terminación: **02 de Septiembre 2022**

Plazo de ejecución: **120 días naturales**

Conforme al periodo del diferimiento de inicio

Fecha de inicio: **06 de Junio 2022**

Fecha de terminación: **03 de Octubre 2022**

Plazo de ejecución: **120 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 de Mayo 2022**

Fecha de terminación: **27 de Julio 2023**

Plazo de ejecución: **417 días naturales**



S.E.G.E.  
ESC. SEC. GRAL.  
"ADOLFO LOPEZ MATEOS"  
C.C.T. 24DES0105U  
EBANO, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	06 AL 19 DE MAYO DEL 2022	\$125,223.31	\$20,035.73	\$145,259.04	
02	20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2022	\$256,912.35	\$41,105.98	\$298,018.33	
03 EXDT	20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2022	\$77,603.97	\$12,416.64	\$90,020.61	
04	21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2022	\$265,871.04	\$42,539.37	\$308,410.41	
05	22 DE JULIO AL 21 AGOSTO DEL 2022	\$335,117.61	\$53,618.82	\$388,736.43	
06 EXDT FINIQUITO	22 AGOSTO 2022 AL 27 DE JULIO DEL 2023	\$176,517.38	\$28,242.78	\$204,760.16	
<b>TOTAL</b>		<b>\$746,021.22</b>	<b>\$119,363.40</b>	<b>\$1,435,204.98</b>	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA .S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- Plano General (de conjunto) del Plantel.




*[Signature]*

*[Signature]*  
S.E.P.E.  
ESC. SEC. GRAL.  
"ADOLFO LOPEZ MATEOS"  
C.C.T. 240ES01096  
EBANO, S.L.



**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo financiero Aserta, fianza N°. 3848-13757-0 de fecha 29 de Abril 2022.



Organismo Responsable de la INFE  
ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS

CONTRATISTA

C.P. FRANCISCO JAVIER MACIAS  
MONTEJO

Representante Legal Empresa  
ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA  
S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Representante del CEPS

C.P. Nelly García Corona

ARO. LISBETH LARA DE LA CRUZ  
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION  
DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSÍ



Directora

S.E.G.E.  
ESC. SEC. GRAL  
"ADOLFO LOPEZ MATEOS"  
C.C.T. 24DES0109U  
EBANO, S.L.P

Mtra. Rosalía del Carmen  
Abarrotes y Construcciones Xonaca S.A. de C.V.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IO-924037999-E10-2022-A de fecha 27 de Julio 2023
