



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTR. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 97.36 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 10", 18 DESCARGA, 18 REGISTRO DOMICILIARIO, 3 POZOS DE VISITA, 18 TOMAS DOMICILIARIAS, 210.13 M2 DE BANQUETAS Y 729.27 M2 DE PAVIMENTO

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-1-2024

IMPORTE: \$1,559,860.92

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____ \$ _____

REDUCCION: _____ \$ _____

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 29 de febrero de 2024

FECHA DE TERMINO: 29 de abril de 2024

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTR. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 97.36 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 10", 18 DESCARGA, 18 REGISTRO DOMICILIARIO,

3 POZOS DE VISITA, 18 TOMAS DOMICILIARIAS, 210.13 M2 DE BANQUETAS Y 729.27 M2 DE PAVIMENTO

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-1-2024

IMPORTE: \$1,559,860.92

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 29 de febrero de 2024

FECHA DE TERMINO: 29 de abril de 2024

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Vo. Bo.

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO

SOCIAL

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
1

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTRO. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2024

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS


Jueves, 29 de Febrero de 2024

El día de hoy se hizo entrega de los planos y puesta a disposición del lugar al contratista para el inicio de la obra.

Viernes, 01 de Marzo de 2024

En la visita del día de hoy se observaron los trabajos correspondientes al trazo y nivelación de la línea de Drenaje sanitario, así como el inicio de la excavación en cepa por medios mecánicos, donde debido a las condiciones del terreno se realizó una zanja de 0.70 cm de ancho y 0.60 cm de alto.

Excavación para la zona de la red de alcantarillado.

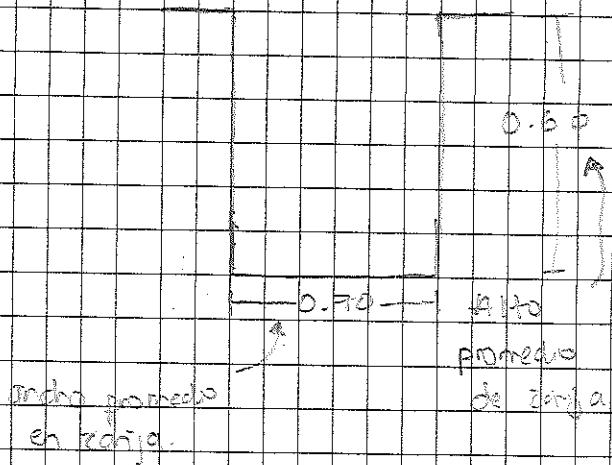

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTRO. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2024

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Lunes, 04 de marzo de 2024
Visitando la obra ubicada en la calle Heroes Potosinos el día de hoy se observaron los trabajos correspondientes al suministro y colocación de plantilla o cama de arena, al igual que la construcción de los pozos de visita.

Miercoles, 06 de marzo de 2024
En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes al suministro y colocación de la tubería de polietileno de alta densidad de 10".

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

4

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTRO. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2024

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

que la construcción de los registros domiciliarios.


Jueves, 14 de marzo de 2024

En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al relleno compactado, en capas de 0.20 cm con material producto de excavación.

Viernes, 15 de marzo de 2024

Visitando la calle el día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al trazo y nivelación de banquetas y guarniciones así como el trazo y nivelación para pavimento, por la tarde se inicio el trabajo de excavación en cepa, así como para

Zanja de drenaje:

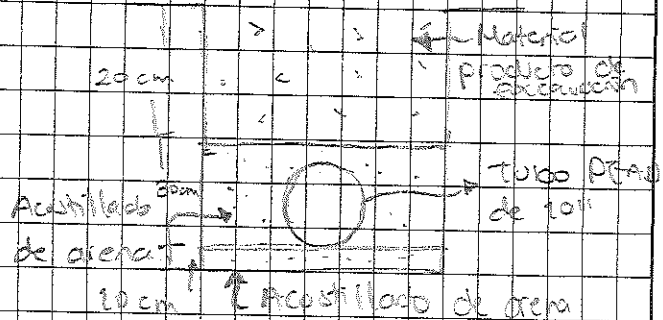

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

5

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTRO. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2024

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

abrir el cajón.

Lunes 18 de marzo de 2024

En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a la compactación del terreno natural así como se inició el trabajo correspondiente a suministro y colocación de base hidráulica.

Jueves, 21 de marzo de 2024

Visitando la obra el día de hoy se observaron los trabajos correspondientes a suministro y colocación de concreto hidráulico $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, este día una contratista solicitó que se pavimentara un tramo extra de 8m de largo x 9.60 y 7.70 aprox.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

7

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES POTOSINOS, ENTRE CALLE FCO. VILLA Y FALDAS DEL CERRO, BARRIO DE NTRO. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2024

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Jueves, 28 de marzo de 2024
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al corte y sellado de las juntas de dilatación, así como el suministro y colocación de pintura amarilla en garnición.

Lunes, 01 de abril de 2024
El día de hoy en la calle Heroes Potosinos se realizó la limpieza gruesa y fina final de los trabajos.

Martes, 02 de abril de 2024
El día de hoy se dieron por terminados los trabajos.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ
