



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

### MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

#### HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 93.00 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 10", 1 DESCARGA, 1 REGISTRO DOMICILIARIO Y  
2 POZOS DE VISITA.

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-4-2024

IMPORTE: \$173,901.23

#### MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: \$

REDUCCION: \$

CONTRATISTA: GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

FECHA DE INICIO: 5 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINO: 3 de abril de 2024

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA



**BITACORA**



**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.**

JARDIN HIDALGO NO 08  
ZONA CENTRO  
TEL: (486) 86 3-23-59  
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO  
1

LIBRETA  
1

**INCIDENCIAS**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-4-2024**

FECHA: **05 DE MARZO DE 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2024**


**DESCRIPCION DEL CONCEPTO**

**CROQUIS**

Martes, 05 de Marzo de 2024  
El día de hoy se hizo entrega de los planos y presta a disposición del lugar al contratista para el inicio de los trabajos.

Miercoles, 06 de Marzo de 2024  
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al trazo y nivelación de la línea de drenaje sanitario, así como el inicio de la excavación en cepa por medios mecánicos, de las siguientes dimensiones, 0.80 mts de ancho x 1.00 metro de profundidad.

Zanja de Drenaje

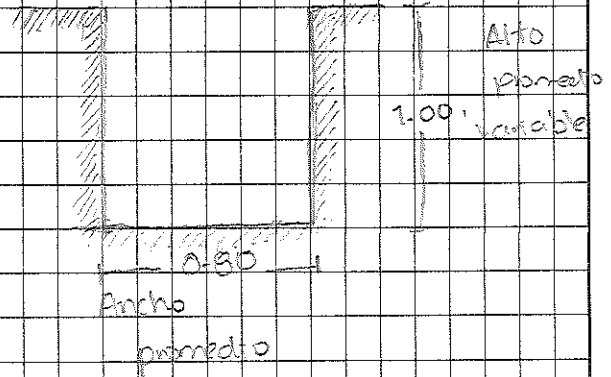

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P**  
JARDIN HIDALGO NO 08  
ZONA CENTRO  
TEL: (486) 86 3-23-59  
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO  
2

LIBRETA  
1

## INCIDENCIAS

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**  
LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**  
CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**  
CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-4-2024**  
FECHA: **05 DE MARZO DE 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2024**

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

### CROQUIS

Viernes, 08 de Marzo de 2024  
En la visita del día de hoy se observan trabajos correspondientes al suministro y colocación de la plantilla o cama de arena con 10 cm de espesor, para recibir la tubería.

Suministro y colocación de la cama de arena:

Lunes, 11 de marzo de 2024  
Visitando la calle privada de Independencia el día de hoy se observaron los trabajos correspondientes a la construcción de los pozos de visita con 1.20 mts en la base y 0.60 mts en la parte superior del mismo, construido con tabicon.

0-10  
arena.

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

**BITACORA**



**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P**

JARDIN HIDALGO NO 08  
ZONA CENTRO  
TEL: (486) 86 3-23-59  
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO  
3

LIBRETA  
1

**INCIDENCIAS**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-4-2024**


FECHA: **05 DE MARZO DE 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2024**

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO**

**CROQUIS**

Miercoles, 13 de Marzo de 2024  
Visitando la calle el día de hoy se observaron trabajos correspondientes al suministro y colocación de la tubería de polietileno de alta densidad de 10", al igual que la construcción de registro domiciliario y descarga domiciliaria.

Viernes, 15 de Marzo de 2024  
En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes al acostillado de arena hasta 15 cm por encima de lomo de tubo.

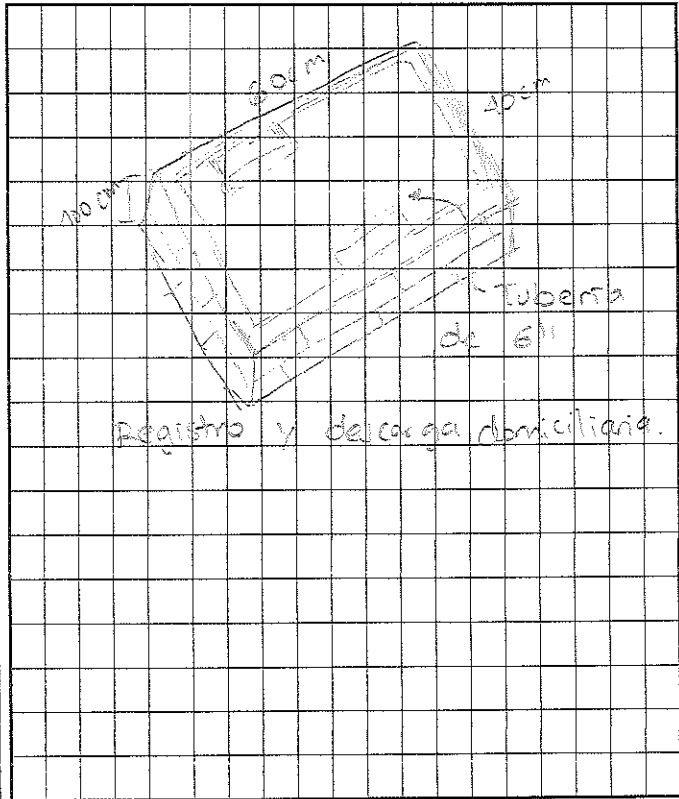

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

**BITACORA**



**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P**  
JARDIN HIDALGO NO 08  
ZONA CENTRO  
TEL: (486) 86 3-23-59  
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO  
4

LIBRETA  
1

**INCIDENCIAS**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-4-2024**


FECHA: **05 DE MARZO DE 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2024**

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO**

**CROQUIS**

Miercoles, 20 de marzo de 2024  
En la visita del dia de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al relleno compactado por medios mecanicos en capas de 20 cm, utilizando material producto de excavacion.

Martes, 26 de marzo de 2024  
El dia de hoy se dieron por terminados los trabajos de la misma y se hizo entrega de la obra.

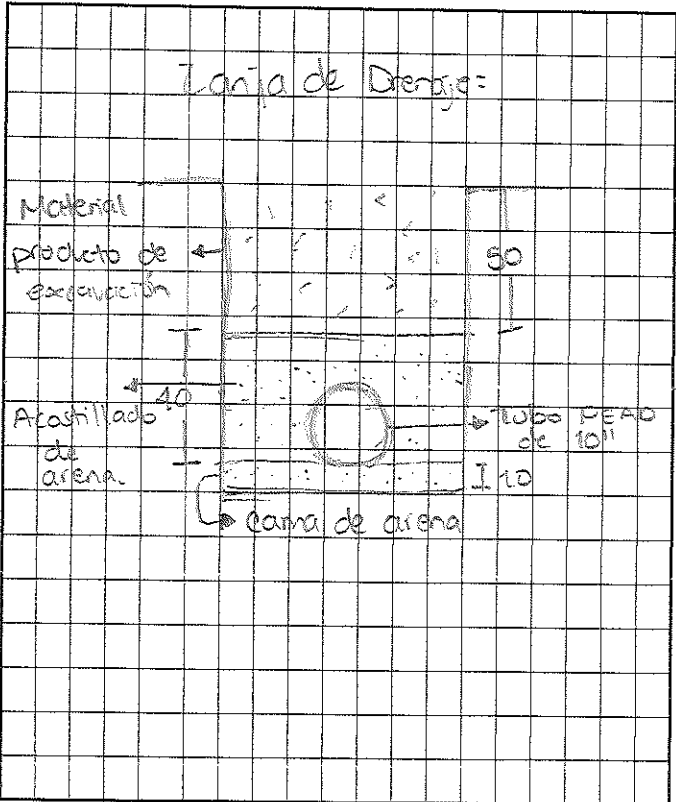

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ
