

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Con la presente fecha se realiza la apertura de la siguiente bitacora de la obra denominada "Construcción de drenaje sanitario en acceso a San Ciró de Acosta". Estando presentes por parte del municipio el Ing. César Augusto de la Cruz García designado Supervisor de esta obra y al Ing. Sergio Refugio Amador Huerta designado como superintendente por parte del contratista. Comenzando con los trabajos correspondientes al trazo y nivelación del terreno además con la excavación correspondiente.

CROQUIS:

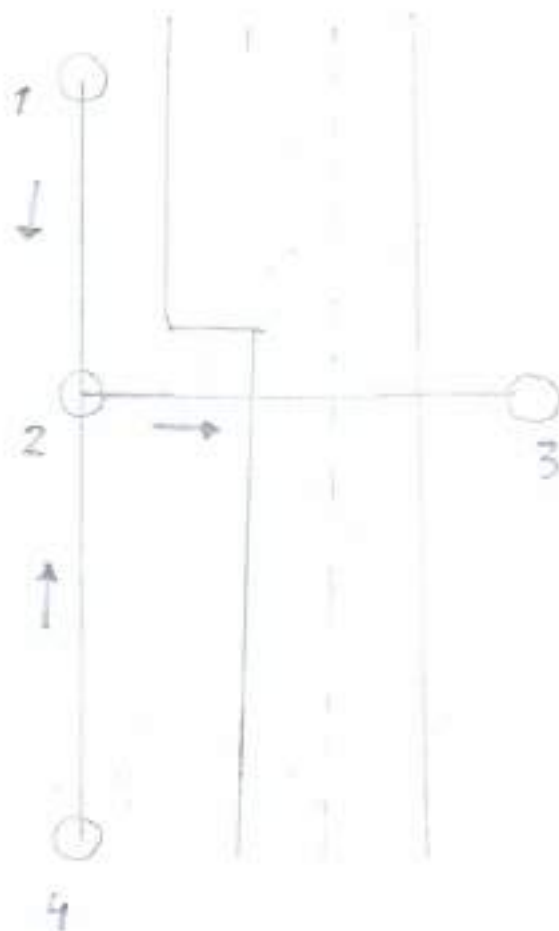

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

NOTAS:

Dentro de la supervisión del día de hoy se aprecia el término de la excavación de tramo 1-2 y 2-4 continuando con la colocación de plantilla de arena y colocación de tubería PEAD de 10" para posteriormente realizar el acostillado a dicha tubería.

Se comienza con la construcción del pozo de visita 1 y 4.

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:


OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

CROQUIS:

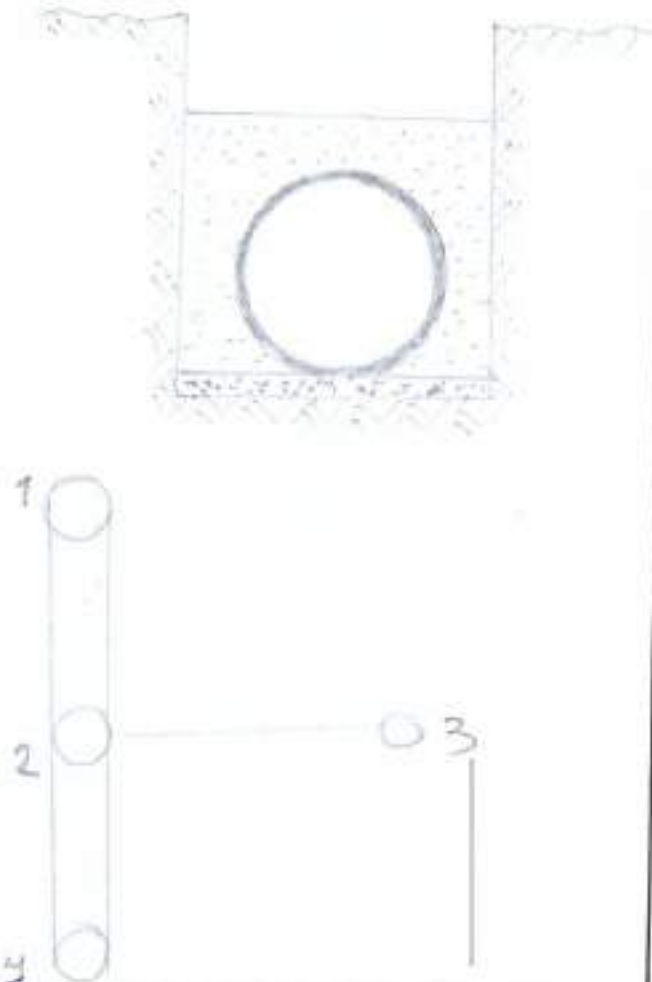

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se realiza el cierre de la presente bitacora correspondiente a la obra "Construcción de drenaje sanitario en acceso a San Ciró de Acosta" concluyendo todos los trabajos contratados en fecha establecida y consecutivamente ejecutados.

Se realiza el cierre estando presente el Ing. Sergio Repugio Amador Horta como superintendente y el Ing. Cesar Augusto de la Cruz como supervisor.

CROQUIS:

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE
