

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 22-ABRIL-20 FOLIO: 01

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. MSC-R33-FFM-AD2/56/03/OA-02-20

OBRA Y/O ACCION: "MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICION FINAL DE AGUA TRATADA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA"

METAS: 1 UNIDAD: OBRA

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27 DE ABRIL DE 2020


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 12 DE MAYO DE 2020

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DISPOSICION FINAL DE EL AGUA TRATADA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN SU SEGUNDA ETAPA.

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON LOS DE EXCAVACION PARA EL DESASOLUE DE EL CANAL ADELAN DE EL MOVIMIENTO DE ESTE MATERIAL SACADO DE HULEDOO FUERA DE ESTE CANAL.

CROQUIS:

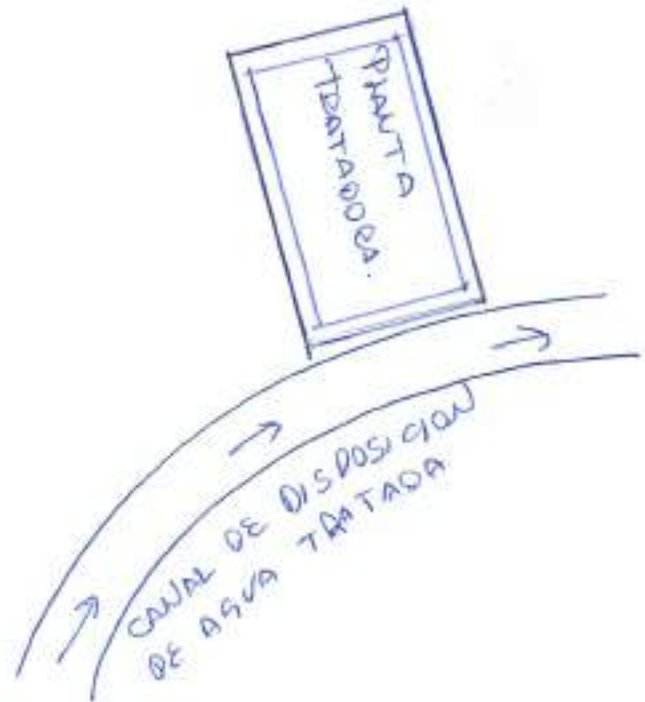

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESARROLLO DE ARROYO CON MAQUINA EXCAVADORA.

ADEMAS SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE MATERIAL SECO PARA LA FORMACION DE TALUD PARA LOGRAR UNA SECCION TIPO EN ESTE ARROYO

CROQUIS:

SECCION TIPO EN ARROYO.



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICION FINAL DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN ESTA CABEERA MUNICIPAL. A ESTA FECHA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CANAL Y FORMACION DE TALUD SE HAN REALIZADO DEL 0+000 AL 0+150 SEGUN EL PLANO DE LA OBRA.

CROQUIS:

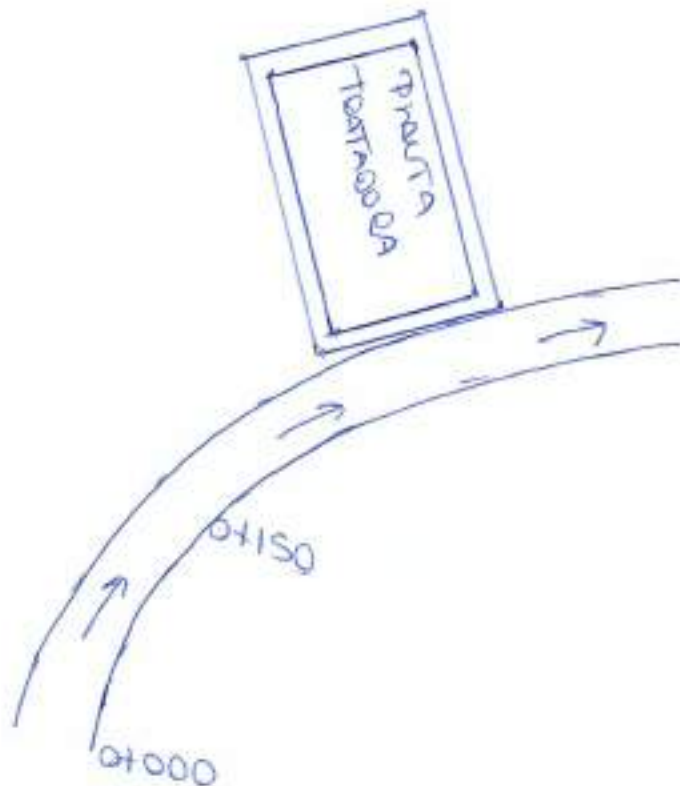

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 12-MAYO-20 FOLIO: 04

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.: MSC-183-FFM-AD2/56/03/OA-02-20

OBRA Y/O ACCION: "MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICION FINAL DE AGUA TRATADA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA"

METAS: 1 UNIDAD: OBRA


FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 12 DE MAYO DE 2020

NOTAS:

SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA COMO SON DE DESARROLVE DE ARROYO O CAJAL POR MEDIO DE EXCAUACION CON MAQUINARIA PESADA COMO ES UNA EXCAVADORA. ADEMAS DE LA COLOCACION DE MATERIAL SECO PARA LA FORLACION DE TALUD Y LOGRAR UNA SECCION TIPO EN TODO ESTE CAJAL EN TOTAL SE LE DIO MANTENIMIENTO A 300 ML DE ESTE CAJAL

CROQUIS:

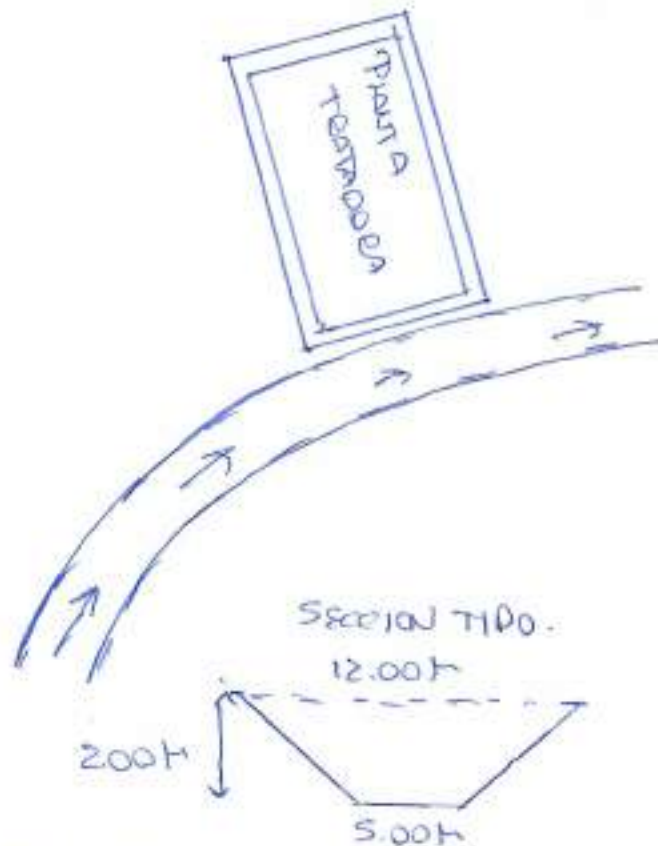

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
