

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:

Se aprueba el termino de la colocacion de banquetas y guarniciones ademas de la colocacion del concreto f/c=250 se comienza con la colocacion del concreto a 3 dias sobre el cruce de carretera el cual se hara primero un carril para cuando pase 3 dias sobre el otro carril

### CROQUIS:

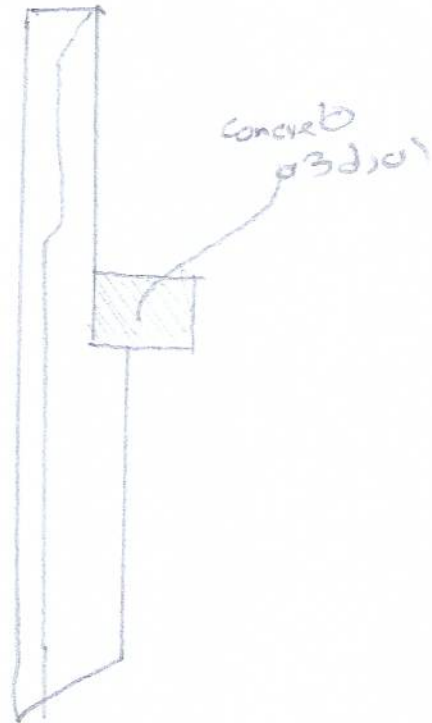

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y  
OBRAS PUBLICAS

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA

*[Signature]*  
SUPERINTENDENTE

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

El día de hoy se aproxima la conclusión de todos los trabajos contratados realizados en tiempo y forma con lo cual con la presente fecha se cierra la bitácora estando presentes el Ing. Sergio Refugio Amador Huerta y el Ing. Cesar Augusto delacruz garza



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y  
OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE
