

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

## CROQUIS:

EN ESTA FECHA CONTINUAN DETEUIDOS LOS TRABAJOS CONTENPIDADOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO ESTO POR LOS DIAS EN LOS QUE SE PRESENTO LLUVIA EN ESTA ZONA SOLO SE OBSERVA QUE ESTO GENERARA UN RETARDO EN LA OBRA ADEMAS DE QUE SE ENCONTRO PIEDRA EN

LA EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR LA TUBERIA CONCEPTO QUE NO SE CONTEMPLA EN EL CALENDARIO DE OBRA (EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III) SE RECOMIENDA AL ~~AL~~ SUPERINTELENDETE DE LA OBRA SOLICITAR UNA PRORROGA PARA AMPLIAR EL PERIODO DE CONSTRUCCION

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTELENDETE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:   
MUNICIPIO:   
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.   
OBRA Y/O ACCION:   
METAS:  UNIDAD:   
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:   
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


## NOTAS:

EN ESTA SE REANUDAN LOS TRABAJOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO.  
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON LOS DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON MAQUINA RETROEXCAVADORA DE MARTILLO EN EL TRAMO DE LA OBRA UBICADO ENTRE LOS PUNTOS P-B AL PUNTO P-A

## CROQUIS:

DEACUERDO AL PLANO DE LA OBRA.

CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO

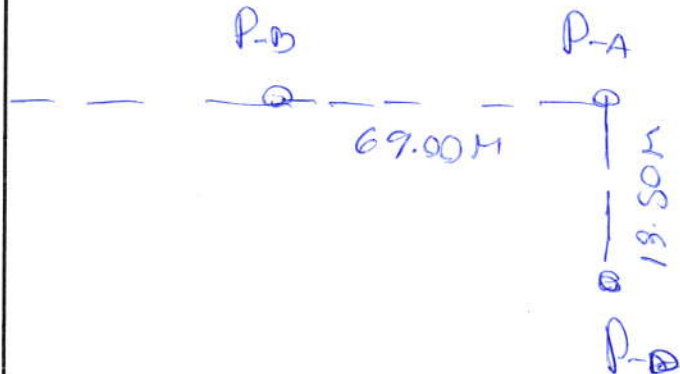

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
