

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO : SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 2-ABRIL-21 FOLIO: 01


DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/OA-03-21
OBRA Y/O ACCION: "REHABILITACION DE CALLE MOCTEZUMA CON DOBLE RIEGO DE SELLO"
METAS: 6,017.99 UNIDAD: M2
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 02-abr-21
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 16-abr-21

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE INICIO CON LA LIMPIEZA DE LOS BACHES UBICADOS SOBRE EL TRAMO DE LA CALLE MOCTEZUMA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA DE REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO, ESTA LIMPIEZA SE REALIZA POR MEDIOS MANUALES POR MEDIO DE UN BARREDO CON ESCOBA.

CROQUIS:

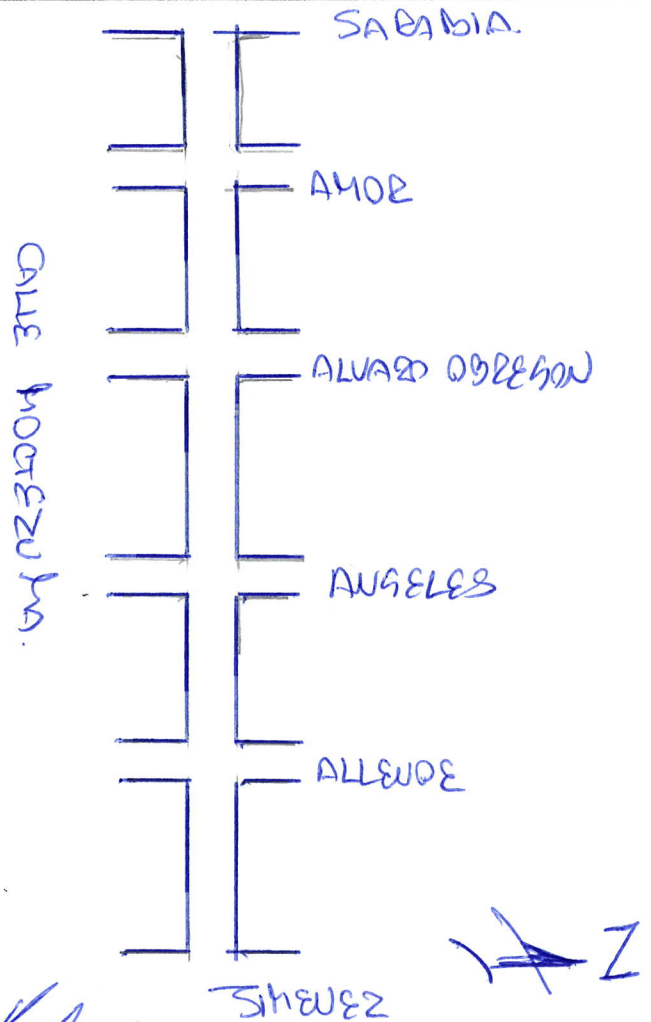

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, ESTO SE REALIZO CON LA REPARACION DE LOS BACHES UNICADOS EN EL TRAMO DE LA OBRA CON LA COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA Y EL COMPACTADO DE ESTE MATERIAL EN LOS BACHES.

CROQUIS:

TAMBIEN SE SUMINISTRARON Y SE COLOCARON DOS CAPAS DE EMULSION ASFALTICA Y DOS RIEGOS DE SELLO TEXTURADO Y AL FINAL LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
