

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:   
MUNICIPIO:   
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.   
OBRA Y/O ACCION:   
METAS:  UNIDAD:   
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:   
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

11/12/21

Se inicia con los trabajos de Limpieza, Nivelación del Area de Trabajo.

Demolicion de Banquetas y Guarniciones existentes, tala y Desentraice de Arboles en las 2 Cuadras

Plaza Bo. de Santiago

Calle Morelos

Primaria

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

Se realiza trabajos de compactacion de Material para Banquetas.  
Se realiza forjado de Guarniciones y colado de las mismas.  
Entre las Calles A. Ciró y Plaza del Bo. de Santiago.

## CROQUIS:

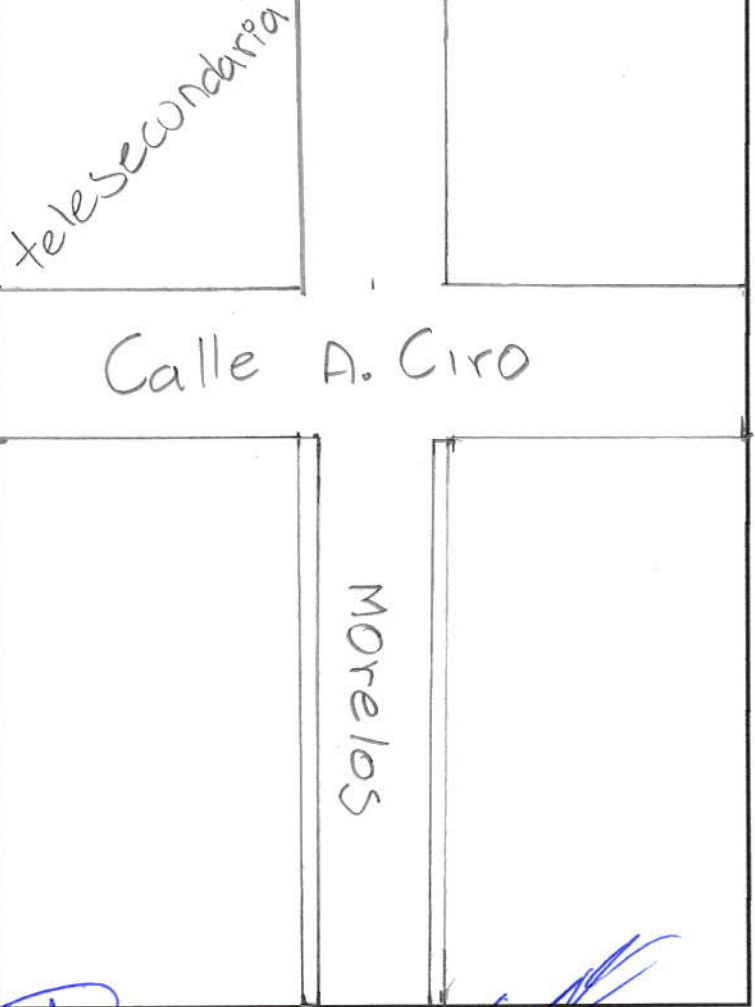

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
**SAN CIRO DE ACOSTA**  
2021-2024

¡Unidos por el Progreso!

## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

Se suministra y coloca concreto en Area de Banquetas, en Ambos Sentidos, entre la calle A. CIRO y Plaza de Bo. Santiago. Previamente se colocó tubería PVC Hidraulico de 2".

## CROQUIS:

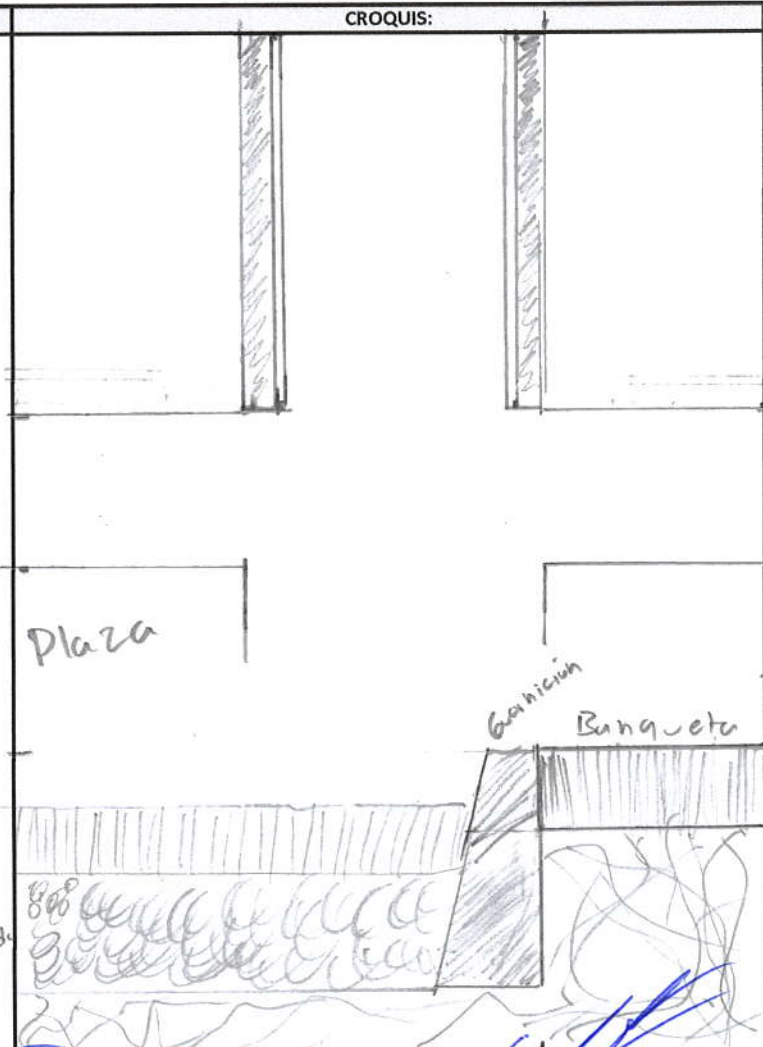

Concreto Hidraulico  
Base compactada

Banqueta

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


## NOTAS:

Se realizan trabajos de suministro, tendido y conformado de Base.

Se encuentran realizadas las 2 cajas de válvulas en Calle Morelos para agua potable.

## CROQUIS:

Base compactada al 100% PUSM 20 cm espesor

  
ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

### OBSERVACIONES PREVIAS:

Concreto Hidraulico

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


### NOTAS:

Se Suministra el Concreto Hidraulico en Calle Morelos Entre Calles A. Ciró y Calle Gutierrez Najera Mediante Concreto Pie Mezclado.

### CROQUIS:

Santiago  
Plaza BO.

Dr. P. Mejia

  
ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON  
SUPERINTENDENTE DE OBRA
