

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
SAN CIRO DE ACOSTA
2021-2024

¡Unidos por el Progreso!

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:

UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL EN DONDE SE CONTEMPLA EL MESORAMIENTO DE LA CAPILLA UBICADA DENTRO DEL PANTEON MUNICIPAL.

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON LOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL

TERRENO, UBICANDO ESSES DE REFERENCIA Y MARCANDO NIVELETAS DE CONTROL PARA LOS DESPLANTES DE LA CIMENTACION TAMBIEN SE REALIZA EL DESPALME Y EXCAVACION POR MEDIAS MECANICAS EN EL AREA TRAZADA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MESORAMIENTO DE TERRENO Y CIMENTACION DE ESTA OBRA.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES FUERA DEL AREA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ADEMAS SE REALIZAN TRABAJOS DE AFINE DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y LA CONTACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINA BALADORA.

CROQUIS:

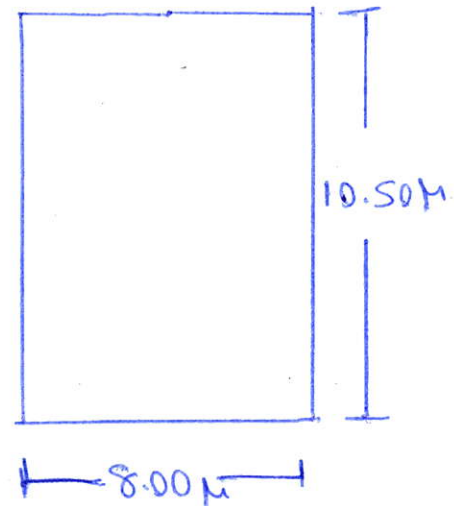

AREA REPARADA PARA LA INCORPORACION DE MATERIAL DE BANCO PARA COMPACTAR AL 95% DE SU P

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON EL ACARreo Y COLOCACION DE MATERIAL DE BAUDO TIPO BASE HIDRAULICA. EN EL AREA PREPARADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DONDE SE CIMENTARA LA LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR.

ESTA BASE HIDRAULICA SE COLOCA Y SE COMPACTA EN CAPAS DE 25 CMS DE ESPESOR.

CROQUIS:

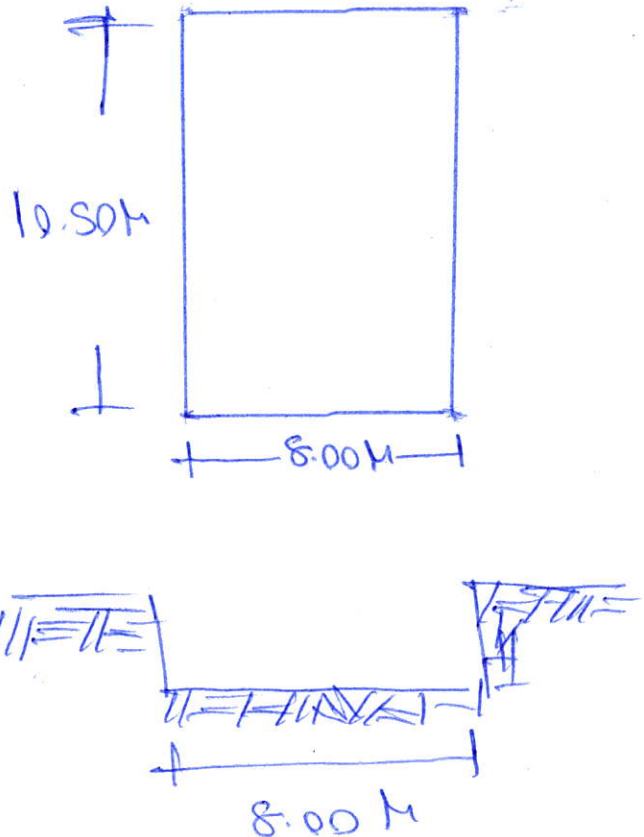

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
