

18 / JUNIO / 2018

CONTRATO NO.

AO-824008937-E1-2018

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOVERDE, ENTRE CALLE GENERAL EPIFANIO CASTILLO Y PROLONGACIÓN ADALBERTO DE AVILA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA.

GRUPO VILLA LIANCA SA DE CV.

REPRESENTANTE: C. ARMANDO VILLASENOR CELIS.

EUGENIO GARZA SADA 425-5

COCONIA LOCALS DEL TECNOLÓGICO

TEL (444) 833 03 83 S.L.P.

EFECTOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CERRITOS.

JARDIN HIDALGO # 8 ZONA CENTRO CP. 79402

TELEFONO 01 (486) 86-3-21-34.

PRESIDENTE: JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ

COORDINADOR: ING. JOSE EDUARDO RATA ZAPATA.

SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SUP. MUNICIPAL.

— 30 JUNIO — 2018 —

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO DE LA CALLE RIQUERDE COLOCANDO NIVELES EN LA LINEA DEL LIMITE PARA REFERENCIA DE NIVEL DE FONDO DE EXCAVACION.

SE DA UNICE ENTREGA DE CATALOGO DE CONCRETOS PARA LA SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATISTA GANADOR. SIN DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

SE INICIAN LOS COTES DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA DEL TERRENO NATURAL EXISTENTE PARA LA COLOCACION DEL DESPLANTE DE LA SUB-RASANTE / ACARME USANDO MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.

SE SOLICITA COTE HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE SOLICITADO, YA QUE LOS ANCHOS DE LA CALLE SON VARIABLES.


ING. MANUEL HAZ

20 / JUNIO / 2018.

CON ESTA FORMA SE CONTINUA LA APERTURA DE CAJÓN HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA, ASÍ MISMO EL RETIRO DE MATERIAL DE CONTRA HASTA LÍMITES AUTORIZADOS.

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS GRISAS Y CONECTARSE AL TUBO CENTRAL SE CONTINUA CON 26 DESCARGAS

SE INCLUYEN DENTRO DEL PROYECTO 2 POZOS DE VISITA LOS CUALES NO SE CONSIDERAN EN CATALOGO INICIAL DE PROYECTO.

LAS REPARACIONES DE TUBOS DOMICILIARIAS SON A CUENTA DEL CONTRATISTA.

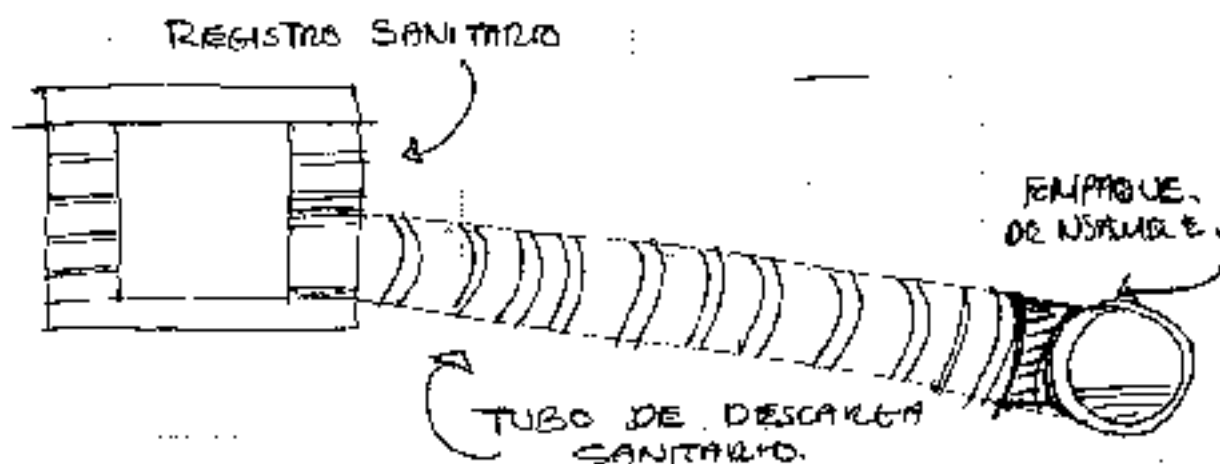

ING. MANUEL HOY.

10/AGOSTO/2010

CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
DE DRENAJE SANITARIO

SE INICIA CON LA EXCAVACION POR
MEDIO MECANICOS DE LOS ZANJAS.
PARA CONECTARSE A LA LINEA PRINCIPAL

ADEMAS SE CONSTRUYE REGISTRO
SANITARIO AL LIMITE DE PROPIEDAD



COLOCANDO TUBO DE POLIETILENO DE 6" ϕ
DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO
INTERIOR LISO INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE

[Signature]
ING. FRANCISCO H. H. H.

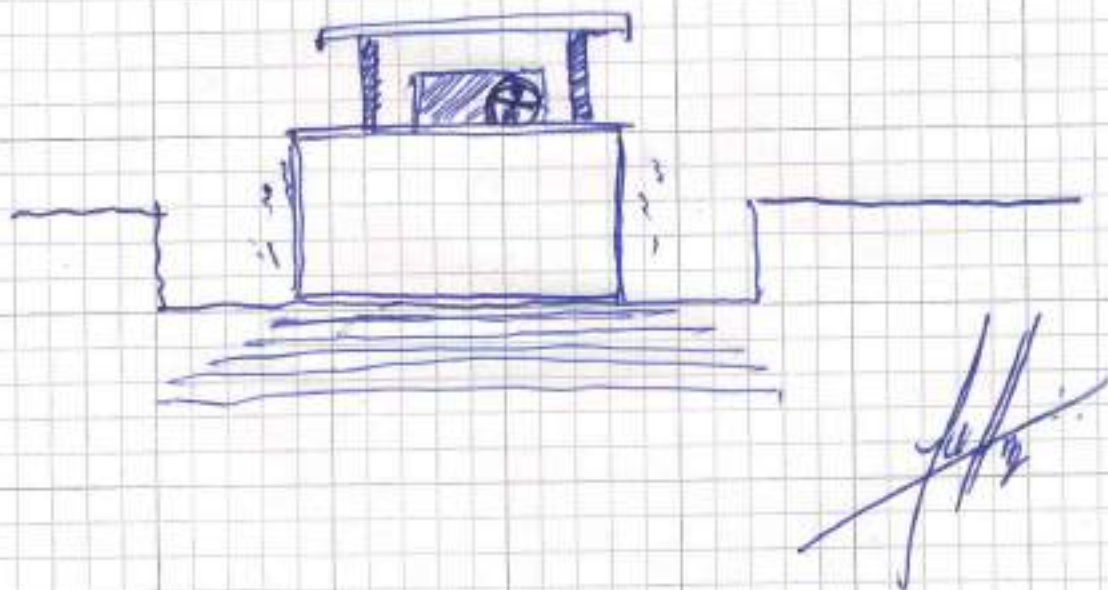
30/ AGOSTO/ 2018

12

CON ESTA FECHA SE CONTINA CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE 60X40 DE TABIQUE RECOCIDO 15X24 COLOCANDOSE EN EL LIMITE DE LA PROPIEDAD, ADEMAS SE CONTINA CON LA CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL PRODUCO DEL CORTE.

SE REALIZA LA EXCAVACION DE DESCARGAS BOMBIERIAS ADICIONALES. SOLICITADAS POR EL COMITE DE OBRAS.

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, E INCORPORA AGUA PARA MEJOR COMPACTACION.



20 DE SEPTIEMBRE - 2018

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA Y TIENDE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE ACA RE LLONAMIENTO, HOMOGENIZACION E INCORPORACION DE AGUA, AFINE BOMBEO,

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA LOS REPORTES DE LABORATORIO DE LA COLOCACION DE LA BASE HIDRAULICA. ASI COMO LA CANTIDAD DE LA MISMA DEL PROVEEDOR.

SE TIENDE LA BASE EN MONTONES DE CANTON DE $14 m^3$ COLOCADO EN SERIES AL VISO DE SE TIENDE CON MOTOCONFORMADORA TAMBIEN SE HOMOGENIZADA CON AGUA DE PAPA CURCULANDOLA Y TENDIENDOLA SOBRE LOS NIVELES ESTABLECIDOS DEL VISUAL DE BASE.



ING. DANIEL HOJ.

25/ SEPTIEMBRE - 2018.

SE DETERMINAN CANTIDADES EXTRAORDINARIAS DE OBRA
 EN ALGUNOS CONCEPTOS DE FERRACERIAS Y CORTES
 LAS CORTES SE DETECTARON PERMANENTE Y NO SE
 ENCUENTRAN EN EL CATALOGO DE CONTRATO ASI MISMO
 SOLICITO CAMBIO DE CONCEPTOS SIN CUADRAR ASI
 EL CATALOGO DEL PAROC DE CONTRATO.

CON ESTA FORMA DE TIENDE BASE HIDRAULICA
 OCUPADA ASI MISMO SOLICITO POR PARTE
 DE SUPERVISION MUESTRAS DE LABORATORIO
 DE LA COMPACTACION Y CALIDAD DE BASE HCA.

SE DA AVISO A COORDINACION PARA APOYO
 DE DOCUMENTACION NECESARIA.

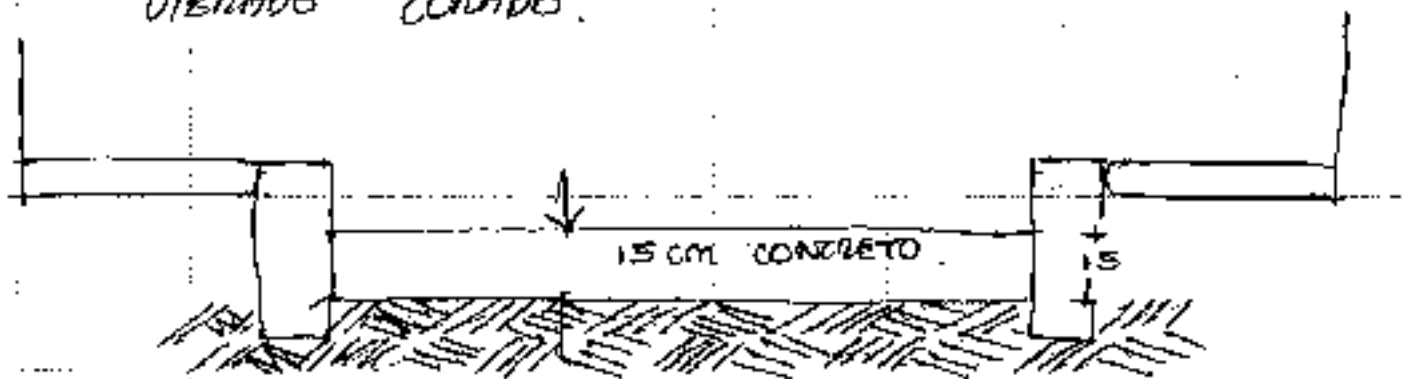

 HUI MANUEL HUI

02 / OCTUBRE / 2018.

SE CONTINA CON LA BASE HIDRAULICA Y EL FENDIDO DE LA CUISILLO EN TODO EL ANCHO DE LA CORONA. COMPACTADA CON RODILLO VIBRANTE. Y

FENDIDO CON AUTOCENTRUMADORA, HOMOGENIZANDO ACUMPLONAMIENTO, HOMOGENIZACION, AFINE EQUIBO Y REPORTE DE LABORATORIO,

SE INICIA LA COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. $1 \frac{1}{2}''$ REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA GRB/10-10 HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, ACABADO ESCOBILLADO, LIMBRADO, DESLIMBRADO, VIBRADO CUATRO.



[Handwritten signature]

26 / OCTUBRE / 2018

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AFECTO EN OBRA PARA PAVIMENTO DE 15 CCM DE ESPESOR $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ P.M.A. $3/4''$ Y $1\frac{1}{2}''$ REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA $6 \times 6 \times 10-10$ CONCRETO ACABADO DILUADO, CUBRADO Y DESCUBRADO, Y CURADO.

COLOCANDO UNA SUPERFICIE DE 140 m^2 DIARIOS DE CONCRETO AFECTO EN OBRA

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. ADEMÁS SE SOLICITA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE GUARDACIONES Y BANDEJAS.


ING. HAZ.
