



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

CENTENARIO No. 226 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610
TEL. Y FAX (487) 2-06-03 2-29-39 2-52-12

PRUEBA DE HERMETICIDAD

| | |
|---|---------------|
| OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE | FECHA: |
|---|---------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| CONTRATISTA: | PRUEBA: HERMETICIDAD |
|---------------------|-----------------------------|

DESCRIPCION

A la fecha se ha realizado prueba de hermeticidad a la ampliacion de agua potable de calle [redacted] en tuberia de PVC hidraulico RD 26 de 3" de diametro. En presencia del [redacted] como contratista de obra y por otra parte el Ing. José de Jesús Feretiz Rivera como supervisor del Organismo Operador SASAR, se hacen las siguientes observaciones.

TRAMO LIBERADO


de calle [redacted]
Longitud del tramo: [redacted]
Diametro de Tuberia: [redacted]
Material de tuberia: [redacted]
Tomas de Agua: [redacted]

OBSERVACIONES

Durante los minutos que duro la prueba, no existieron perdidas, la prueba de hizo an base a la normatividad manejada por la CONAGUA y en cumplimiento a su normativa es que se libera dicho tramo.



CROQUIS

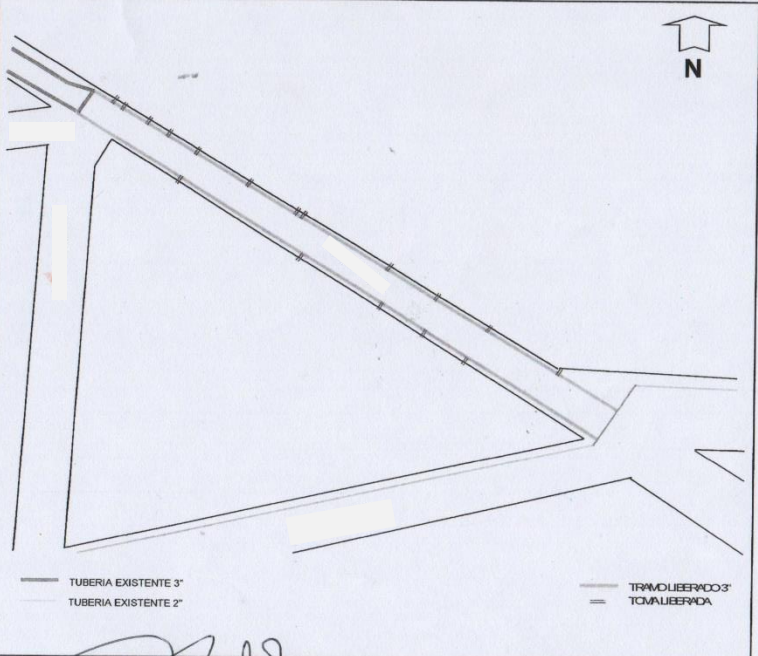

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| CONTRATISTA | SUPERVISOR |
| [redacted] | [redacted] |
| | ING. JOSE DE JESUS FERRETIZ R. |
